

冊六頭身中一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其文 廷順 辦事官 榮源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處槽底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大槽頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大槽頭段灰土進頭二三七券二十六槽築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大槽頭段灰土進小券八槽加倍充剝行碼一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

第一次報告

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本
卷 冊六
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 貴重-71
編號 BX9000600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷號

第 冊
No. 4881
東方文化學院東京研究所

妃園殿頭段報告
一因不齊未會列號



別 證
甲 71



地圖院工程報告八月初六至初十日

代監督 張光照 監修 朱開第 辦事官 沈承俊 謹將廠商具報

八月初六日至初十日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐一查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂並隧道成搭罩棚頭停兩坡身縫第六層席已齊

現縫第七層席

甌園並隧道地脚起剷大槽

羅園牆內院南面捲空地勢平墊現行夯碼

以上東昇廠現修

西寶頂甌園並隧道現剷挖大槽

以上興隆廠現修



宣統二年八月十一日


北

大牆

大牆

大牆

南

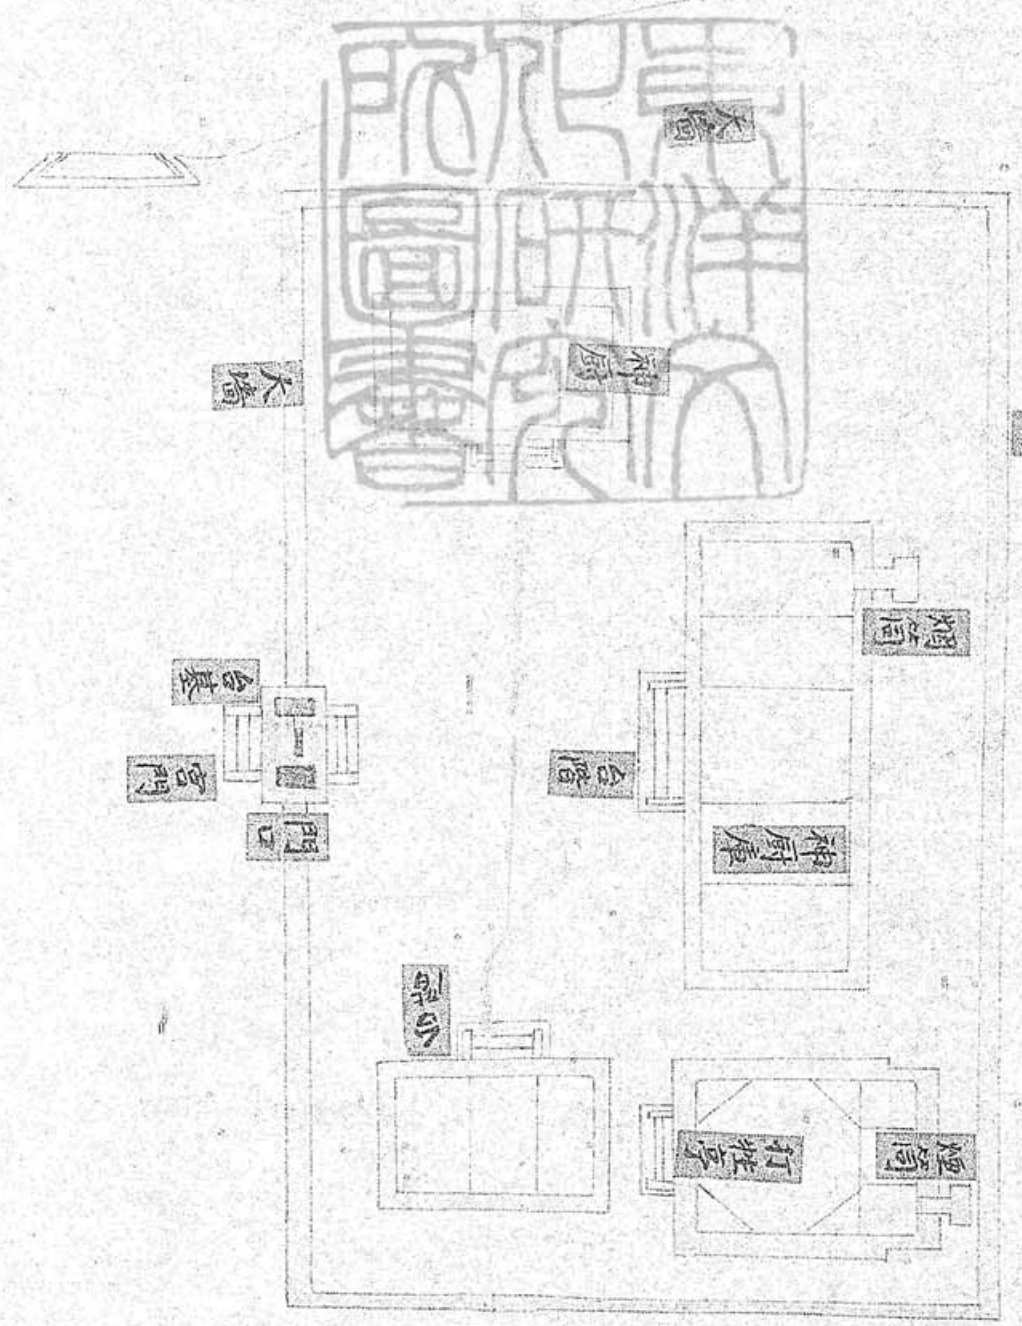

水亭



他園窺頭段工程報告八月十一至十五

代監督遐齡監修廷順辦事官沈承俊 李廷瑞謹

將廠商具報八月十一日至十五日內除十五日因中

秋節放工外所有四日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開列清單

恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂並隧道罩棚頭停坡身縫第七層席已齊

輓券並隧道地腳起創大槽出運渣土

羅券牆內院當南面跨空地勢平墊現行夯碼

以上東昇廠現修

西寶頂輓券並隧道現創挖大槽

以上興隆廠現修



宣統二年八月十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告附錄

代監督選齡監修
朱其文 綸 廷 順
辦事官
李廷瑞 查富 方寶廉
謹將廠具報八月十六日
至二十日恭修

妃園寢工程詳細情形
代監督
等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂甃券並隧道地脚起創大增出運渣土

羅卷牆內院當南面倚空地勢平墊現行分碼

以上東昇廠現修

西寶頂甃券並隧道現創挖大增

以上興隆廠現修



宣統二年八月 二十一日



崇陵妃園寢頭段工程報告
卷之二十一

監督蔣式理 監修 朱其綸 辦事官 查富職 李廷瑞 謹將廠商具報八月二十一日至二十五日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異開具清單 恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂甃券並隧道起創大槽出運渣土

以上東昇廠現修

西寶頂甃券並隧道現已創挖大槽

以上興隆廠現修



宣統二年八月 二十七 日



崇陵妃園寢頭段工程報告八月二十六至二十九日

代監督 李兆麟 監修 朱廷瑞 辦事官 方寶康 謹將廠商具報

八月二十六日至二十九日恭修

妃園寢工程詳細情形 代監督 等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

西寶頂甄券並隧道地脚起創大增出運渣土磚券內現砸柏木
椿金剛牆左段由南起二路第十三棵入地一丈一尺第三路第十
三棵入地一丈六寸右段由南起第二路第一棵入地一丈六寸第
三路第一棵入地一丈七寸共下椿四棵

以上東昇廠現



右寶頂甄券分位創增已齋現已築打柏木椿金剛牆左段
由南起第二路第十棵入地八尺七寸第三路第四棵入地九
尺三寸第十棵入地一丈一尺第十三棵入地九尺右段第一路
由南起第一棵入地八尺八寸第二棵入地九尺二寸第二路由南
起第一棵入地八尺五寸第二棵入地八尺三寸第三路由南起第
一棵入地八尺八寸第二棵入地八尺四寸第十二棵入地八尺八寸
第十三棵入地八尺四寸中段由南起第二路第三棵第四棵
各入地八尺八寸第三路由南起第四棵入地八尺三寸共下椿

十五棵

以上興隆廠現做



絕園寢頭段工程報告九月初一至初五日

代監督 張光照 監修 顧璣 辦事官 李廷瑞 謹將厥商具報九月
初一日至初五日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂執券並隧道地脚起創大墻出運渣土已齊現砸柏

木樁金剛牆左段由南起第二路第五棵入地一丈一尺六寸

第六棵入地一丈一尺七寸第七棵入地一丈一尺七寸第九棵入

地一丈一尺四寸第十棵入地一丈一尺四寸第十二棵入地一丈

五寸第三路第五棵入地一丈一尺七寸第六棵入地一丈一尺

七寸第七棵入地一丈一尺七寸第九棵入地一丈一尺三寸第十

棵入地一丈一尺五寸第十二棵入地一丈六寸第四路第五棵

入地一丈一尺一寸第六棵入地一丈一寸第七棵入地一丈一尺三寸第

九棵入地一丈一尺四寸第十棵入地一丈一尺五寸第十二棵入地

一丈一尺第十三棵入地一丈一寸右段由南起第一路第一棵入地

九尺七寸第二棵入地九尺七寸第三棵入地一丈六寸第四棵入

地一丈一尺五寸第五棵入地九尺八寸第六棵入地一丈第十棵入

地九尺八寸第十一棵入地一丈第十二棵入地九尺四寸第十三棵

入地九尺七寸第二路第二棵入地九尺六寸第三棵入地九尺八寸

第四棵入地一丈四寸第五棵入地九尺九寸第六棵入地一丈一寸

第十二棵入地九尺三寸第十三棵入地九尺四寸第三路第二棵

入地九尺五寸第三棵入地一丈五寸第四棵入地一丈一尺五寸

第五棵入地一丈一尺一寸第六棵入地一丈一尺四寸中段由

南起第一路第二棵入地一丈一寸第二路第二棵入地九尺八寸



第五路第一路第二棵入地一丈一寸第二路第二棵入地九尺八寸
第三路第二棵入地九尺三寸第三路第三棵入地九尺五寸第四路第
二棵入地九尺五寸第三棵入地九尺八寸第四棵入地九尺七寸
共下樁四十八棵

以上東昇廠現做

右寶頂現砸柏木樁金剛牆左段由南起第二路第五棵入地九尺
三寸第六棵入地九尺九寸第七棵入地九尺四寸第八棵入地九
尺三寸第九棵入地八尺八寸第三路第五棵入地九尺四寸第六棵
入地一丈一尺第七棵入地一丈一尺五寸第八棵入地九尺第九棵入地
一丈二寸第四路第五棵入地九尺一寸第六棵入地九尺三寸第七棵
入地九尺四寸第八棵入地九尺八寸第九棵入地九尺二寸右段由南起
第一路第三棵入地八尺四寸第四棵入地九尺四寸第五棵入地九尺一寸
第六棵入地八尺二寸第十一棵入地八尺九寸第十二棵入地八尺四寸
第十三棵入地八尺六寸第二路第三棵入地九尺一寸第四棵入地九尺
第五棵入地八尺九寸第六棵入地八尺七寸第七棵入地九尺三寸第
十一棵入地八尺七寸第十二棵入地八尺九寸第十三棵入地八尺二寸
第三路第三棵入地八尺八寸第四棵入地九尺第五棵入地九尺一寸
第六棵入地八尺七寸第七棵入地八尺三寸第八棵入地八尺四寸第十
一棵入地八尺六寸中段由南起第四路第二棵入地八尺六寸第三棵入
地九尺第四棵入地八尺五寸共下樁四十棵

以上興隆廠現做



宣統二年九月初七日



地圖院工程報告九月初六至初十日

代監督遊齡監修顧瑗辦事官李廷瑞謹將廠商具報九月
初六日至初十日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂甄券內現砸栢木椿全剛牆左段由南起第一路第

一棵入地一丈第二棵入地九尺八寸第三棵入地一丈二寸第

四棵入地一丈一寸第五棵入地九尺九寸第九棵入地一丈

一尺七寸第十棵入地九尺八寸第十一棵入地九尺一寸第

十二棵入地九尺八寸第十三棵入地九尺四寸第二路第二

棵第三棵各入地一丈一尺四寸第四棵入地一丈一尺七寸第

十一棵入地一丈七寸第三路第二棵入地一丈一尺三寸第

三棵入地一丈一尺七寸第四棵入地一丈一尺七寸第十一棵

入地一丈一尺四寸第四路第二棵第三棵各入地一丈一尺五

寸第四棵入地九尺二寸第十一棵入地一丈一尺四寸右段由

南起第一路第七棵入地一丈一尺第八棵入地一丈三寸第九

棵入地一丈一寸第二路第七棵入地一丈一尺二寸第八棵第

九棵各入地一丈五寸第十棵入地一丈一尺第三路第七棵

入地一丈一尺一寸第八棵第九棵各入地一丈三寸第四路第一

棵入地九尺六寸第八棵入地一丈七寸第九棵第十棵第十

一棵各入地一丈中段由南起第一路第一棵入地一丈第

三棵入地一丈一尺八寸第四棵入地一丈一尺三寸第二路

第三棵入地一丈二寸第四棵一丈一寸第三路第四棵入地

九尺七寸共下椿四十三棵



九尺七寸共下椿四十三棵

以上東昇廠現做

右寶頂甄券內現砸栢木椿金剛牆左段由南起第一路第一棵第二棵各入地九尺第三棵入地八尺九寸第四棵入地八尺二寸第五棵入地八尺六寸第六棵入地八尺八寸第七十三棵入地八尺第二路第一棵第二棵各入地九尺五寸第三棵入地九尺一寸第四棵入地九尺六寸第十一棵入地八尺六寸第十二棵第十三棵各入地九尺三路第一棵入地一丈六寸第二棵入地一丈二寸第三棵入地九尺一寸第十棵入地八尺九寸第十二棵入地九尺二寸第四路第一棵入地九尺八寸第二棵入地一丈一尺五寸第三棵入地一丈第四棵入地八尺六寸第十棵第十一棵各入地八尺四寸第十二棵入地八尺六寸第十三棵入地八尺八寸右段由南起第一路第七棵第八棵各入地八尺三寸第九棵入地八尺五寸第十棵入地八尺七寸第二路第八棵入地九尺第九棵入地九尺一寸第十棵入地九尺二寸第三路第九棵入地八尺九寸第十棵入地八尺七寸第四路第一棵入地七尺八寸第八棵入地八尺七寸第九棵入地八尺五寸第十棵入地八尺六寸第十一棵第十二棵各入地八尺五寸第十三棵入地七尺九寸中段由南起第一路第三棵入地九尺第四棵入地八尺九寸第三路第三棵入地九尺第四路第一棵入地九尺四寸共下椿四十七棵

以上興隆廠現做



宣統二年九月十一日





地圖工程頭段報
告
明
示

代監督李兆麟 監修顧瑛 辦事官李淑鈞 呂應鑄 謹將廠商具報

李廷瑞 李綬卿

九月十一日至十五日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂歇券內砸柏木椿金剛牆左段由南起第一路第六
 顆入地九尺八寸第七顆入地一丈三寸第八顆入地九尺二
 寸第二路第一顆入地一丈一尺五寸第八顆入地一丈一
 尺七寸第三路第一顆入地一丈一尺六寸第八顆入地一
 丈一尺五寸第四路第一顆入地一丈一尺三寸第八顆入地
 一丈一尺一寸右段由南起第二路第十一顆入地九尺五
 寸第三路第十顆入地一丈第十一顆入地九尺八寸第
 十二顆入地八尺六寸第十三顆入地八尺三寸第四路第
 二顆入地九尺四寸第三顆入地九尺八寸第四顆入地九
 尺五寸第五顆第六顆第七顆各入地八尺九寸第十
 二顆入地九尺八寸第十三顆入地八尺六寸中段由南
 起第二路第一顆一丈四寸第三路第一顆一丈五寸第
 四路第一顆入地一丈三寸共下椿二十五顆

磚券內應碼下柏木椿一百二十顆已砸齊現打柏
木地打

隧道牆內現打柏木地打

以上東昇廠現做

右寶頂磚券內砸柏木椿金剛牆左段由南起第一路第
七顆第八顆第九顆各入地八尺七寸第十顆入地八





北圖藏頭段工程報告九月十六至二十日

監督蔣式理代監督遐齡監修

劉錦藻同

辦事官

李廷瑞

謹將廠商具

報九月十六日至二十日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂軌券並隧道墻內築打柏木地杙及砌指當灌將水

已齊

以上東昇廠現做

右寶頂軌券並隧道分位碼下柏木地杙及砌石指當

灌漿已齊

以上興隆廠現做



宣統二年九月二十一日



上海圖書館藏
九百二十一至二百五十五

代監督 張光照 齡 監修 姚福同 辦事官 鄭寶賢 李廷瑞 謹

將廠商具報九月二十一日至二十五日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開具

清單恭呈

鈞鑒

計開

左寶頂甃券等工程現欲磨細甃並鑿打龍鬚
溝石料

以上東昇廠現做

右寶頂甃券並龍鬚溝等工程現鑿打石料欲

磨細甃

以上興隆廠現做



宣統二年九月二十六日



地圖窠頭段工程九月二十六日至三十日報告

代監督 李兆麟 齡監修 劉錦藻 辦事官 李廷瑞 前將築打 沈學昌 李峻卿

妃園寢左右甄券槽內柏木椿二百四十根已齊具報在案理合將砸椿
數目分位繪圖呈

閱所有九月二十六日至三十日現做工程開列於後

計開

左寶頂甄券等工程砍磨細甄並鑿打龍鬚溝石料

以上東昇殿現做

右寶頂甄券並龍鬚溝等工程鑿石料砍磨細甄

以上興隆殿現做

附呈砸椿分位圖二張



宣統二年 十月 初一日



崇陵北園殿頭段工程報告

代監督遊齡監修 聶憲藩 辦事官 康維門 謹將廠商具報十
年其汶 李廷瑞

月初一日至初五日恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日查勘無異理合開具清單

恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠進匠整打

左甄券龍鬚溝石料砍磨細甄等工

興隆廠進匠整打

右甄券龍鬚溝石料砍磨細甄等工



宣統二年十月

日



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督蔣式理監修
員監落
實以鈞
年其文辦事官
康躍門
李廷瑞謹將廠商具報十月初六

日至初日恭修

如園寢工程詳細情形
監督等逐日查勘無異理合開單恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報進匠鑿打石料

左寶頂磚券龍鬚溝砍磨細磚等工

興隆廠報進匠

右寶頂磚券龍鬚溝等工現鑿打石料砍磨細磚





崇陵妃園寢上程頭段報告

監督蔣式理 聶憲藩 啟 隆
監修實以筠辦事官康躍門 謹將廠商具報恭修
代監督遊 齡 牟其汶 李廷瑞

妃園寢工程詳細情形 監督 等在工逐日查勘無異理合稟

聞伏乞

鈞鑒謹稟

計開

東昇廠報自十月十一日至十五日進匠鑿打石料備辦

左甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工

興隆廠報自十月十一日至十五日進匠鑿打石料備辦

右甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工

十月十六日





崇陵地質工程頭段報告

代監督 李兆麟 監修 李經邁 辦事官 呂應鏞 謹將廠商具報
李廷瑞

恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等在工逐日查勘無異理合開

單恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十月十六日至二十日進匠鑿打石料備辦

左靴券內龍鬚溝並砍磨細靴等工

興隆廠報自十月十六日至二十日進匠鑿打石料備辦

右靴券內龍鬚溝並砍磨細靴等工

二十一日





崇陵地宮工程頭段報告

代監督 張光照 監修 李經邁 辦事官 呂應鏞 等謹將廠商
李廷瑞 具報恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等在工逐日查勘無異理合開
單恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十月二十一日至二十五日進匠鑿打石料備辦
左軌券龍鬚溝並砍磨細軌等工

興隆廠報自十月二十一日至二十五日進匠鑿打石料備辦
右軌券龍鬚溝並砍磨細軌等工

十月二十六日





地圖寢頭段工程報告

監督延鴻 監修李永寶 辦事官呂應鏞 謹將廠商具報恭修
代監督遐齡 年其汶 李廷瑞

妃園寢工程詳細情形 監督等在工逐日查勘無異理合開單呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十月二十六日至三十日除二十八_九三天因雪挂兌
外進匠二日鑿打石料備辦

左甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工

興隆廠報自十月二十六日至三十日除二十七_九三天因雪挂兌
外進匠二日鑿打石料備辦

右甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工



宣統二年十一月初一日



崇陵地園寢工程頭段報告

代監督姚福同 監修朱綸代監督彬傑辦事官李廷瑞 謹將廠
沈承俊 商具報恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等逐日在工查勘無異理合開單

恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十一月初一日至初五日進匠鑿打石料備辦

左甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工

興隆廠報自十一月初一日至初五日進匠鑿打石料備辦

右甄券內龍鬚溝並砍磨細甄等工



宣統二年十一月初七日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遐齡 監修朱綸 辦事官 李方寶 李廷瑞 謹將廠商具報恭修

妃園寢工程詳細情形 代監督 等在工逐日查勘無異理合

開單恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十一月初六日至初十日進匠備辦

左甄券龍鬚溝等工鑿打石料並砍磨細甄

興隆廠報自十一月初六日至初十日進匠備辦

右甄券龍鬚溝等工鑿打石料並砍磨細甄



宣統二年十一月十一日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督趙齡

監修朱給

辦事官

李廷瑞 沈承俊 方寶廉 李綬卿

謹將廠商具報恭修

妃園寢工程詳細情形代監督等在工逐日查勘無異理合開單恭呈

鈞鑒

計開

東昇廠報自十一月十一日至十五日進匠備辦

左甌券龍鬚溝鑿打石料並砍磨細甌等工

興隆廠報自十一月十一日至十五日進匠備辦

右甌券龍鬚溝鑿打石料並砍磨細甌等工



宣統二年十一月十六日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遊齡監修延順年具沒辦事官李廷瑞敬稟者職等在
工逐日恭詣

妃園寢監視一切現自十一月十六日至二十日東昇廠未進匠夫
興隆廠進匠夫五天鑿打石料備辦

右甄券內龍鬚溝砍磨細甄等工並拉運甄石理合稟

聞謹

稟





崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遐齡監修蔭桓辦事官李廷瑞敬稟者職等在
工逐日恭請金龍峪

妃園寢監視一切現自十一月二十一日至二十六日東昇廠報進

匠夫五天鑿打龍鬚溝砍磨細甑興隆廠報進匠夫

五天鑿打龍鬚溝石料砍磨細甑拉運甑石等工理合稟

聞謹

稟





崇陵地園寢工程頭段報告



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遊齡監修

廷順
彭光瑩
年其文

辦事官李廷瑞謹

稟所有廠商恭修

妃園寢工程職等逐日分詣監視現自十一月二十六日至三十

日五天東昇廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甃興隆廠

報進匠鑿打龍鬚溝石料砍磨細甃拉運甃石等工理

合稟

聞謹

稟





崇陵紀園寢工程頭段報告

代監督避齡監修願其延順辦事官李廷瑞謹
稟所有廠商恭修

妃園寢工程代監督等逐日分詣監視現自十二月初一日至
初五日五天東昇廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細
甄等工興隆廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甄並運
甄石等料理合稟

聞謹

稟



宣統二年十二月初六日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遊齡監修廷順辦事官李廷瑞謹
稟所有廠商恭修

妃園寢工程代監督等在工逐日監視一切現自十二月初六日至初十日五天東昇廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甗等工興隆廠報進鑿打龍鬚溝砍磨細甗並運甗石等料理合稟

聞謹

稟



宣統二年十二月

十一

日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督進齡監修
平其汶辦事官李廷瑞謹
稟所有廠商恭修

妃園寢工程代監督等在工逐日監視一切現自十二月十一日至十五
日五天東昇廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甗等工興
隆廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甗並拉運甗石等料
理合稟

聞謹

稟



宣統二年十二月十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督選齡監修 趙鶴齡 廷瑞 順 代監修李廷瑞辦事官 呂應鑄 李翹 葉 稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視一切現自九月初六日

至初十日據各廠商具報進匠五天其工作情形臚列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券背後築打灰土三十五步已齊

隧道背後築打灰土三十五步已齊

鑿打石料

砍磨細甃

興隆廠呈報

右寶頂甃券並隧道背後築打大夯碼灰土由二十一至二十

五步均齊現築打第二十六步灰土隧道背後底築打大夯碼

踏蹬灰土均齊現砌背底灰砌新樣城甃

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨羅圍牆細甃運

土等工

宣統三年九月 十一 日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督退齡監修 趙鶴齡 年其 代監修李廷瑞辦事官 呂應鏞 李翹 稟所有恭修 謹

妃園 寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視一切現自九月初一日至初五

日據各廠商具報進匠五天其工作情形臚列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券背後築打灰土二十三步已齊現接打二十四步灰土

隧道踏蹬築打灰土十五步已齊背後築打灰土二十三步已齊

現接打二十四步灰土並鑿打石料砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券背後並隧道背後均築打灰土由十七步至二十

步灰土已齊現打第二十一步灰土等工

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨羅圍牆

細甄運土等工

宣統三年九月初六日



金陵地質調查報告

代監督遊齡監修

永寶 廷綸

代監修李廷瑞辦事官

康躍 李綬

謹稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自八月二十六日至三十日據各廠

具報所進匠夫工作情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券五券五伏乾擺澄漿停城甄已齊並澄券甄成砌新樣城甄灌漿已齊

現築打月後灰土並整打石料等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券澄券灰砌新樣城甄二十六層已齊

隨道象眼牆及金剛牆乾擺澄漿城甄灌漿並隨砌背後隨式城甄灌漿均齊

聚興水天利天和天順等廠合報均成磨細甄運土等工



宣統三年九月初一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督將式理 監修 永寶 代監督 廷順 代監修 李廷瑞 辦事官 康 隆 綬 門 謹
稟所有恭修

妃園 寢頭段工程 監督 等在工逐日監視一切現自八月二十一日至二十五日據各廠具報所進匠夫工作情形開列於後理合稟

聞謹稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂 甄券三券三伏四券四伏 乾擺澄漿停城 甄已齊現發第五券 乾擺澄漿停城 甄灌漿

隧道 象眼牆 乾擺澄漿停城 甄背後成砌新樣城 甄灌漿並金剛牆成砌新樣城 甄灌漿水已齊 墜打石料

及砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂 甄券伏券 甄均砍細澄漿城 甄五伏五券均齊成砌 蹬券新樣城 甄第六層已齊現砌第二十層 隨時灌漿

隧道 象眼牆並金剛牆現砌澄漿城 甄乾擺隨砌背後

隨式城 甄灌漿內裏背底灰砌新樣城 甄等工

興與永天利天和天順等廠合報均砍磨細 甄運土等工



宣統三年八月二十六日





崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 張光照 監修 朱永綸 代監督 李廷瑞 辦事官 李康躍 謹
廷順 啟
李綬卿

稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自八月十六日至二十日據各廠具報所進匠夫工作情形開列於後理合稟

聞謹稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券二卷二伏乾擺澄漿停城甄已齊現發第三卷乾擺停城甄灌漿

隧道象眼牆現乾擺停城甄背後成砌新樣城甄灌漿

金剛牆成砌新樣城甄灌漿並整打石料砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券伏券甄均砍細澄漿城甄四卷四伏已齊現發第五卷甄隨時灌漿

隧道象眼牆並金剛牆現砌澄漿城甄乾擺隨砌背後隨式城甄灌漿等工

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨細甄運土

宣統三年八月二十一日





崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督遐齡監修年其汶朱開第代監修彬傑辦事官鄭寶賢沈學昌謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督在工逐日監視一切現自八月十日
至十五日據各廠具報除十五日因節停工外進匠四天
其工作情形臚陳於後理合稟
聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券頭券乾擺澄漿停城甃已齊背後築
打灰土十四步已齊

隧道金剛牆現成砌新樣城甃背後築打灰土十
四步已齊並整打石料砍磨細甃等工

興隆廠呈報

右寶頂甃券伏券甃均砍細澄漿城甃二伏二券已齊
現發第三券甃隨時灌漿

隧道內踏蹬灰土並背後灰土築打第十六步已齊
整打龍鬚溝並青白石溝漏豆渣石料溝底蓋等

工

聚興永天利天和天順等廠合報均砍
磨羅券牆細甃並運土等工

宣統三年八月廿六日





崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督選齡監修 朱開第 年其文 代監修 彬 傑 李廷瑞 辦事官 鄭寶賢 沈學昌 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視現自八月初六日至初
十日據各廠具報進匠五天其工做情形臚列於後理合稟

聞謹

稟

東昇廠呈報

左寶頂甄券現成搭券仔砍磨細甄背後築打灰土
隧道象眼牆並金剛牆背後現築打灰土及整打石料等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券第一券伏甄已齊現發第二層券甄

隧道築打大券踏蹬灰土及背後灰土第十一步已齊現打第
十二步灰土並整打龍鬚溝石料等工

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨羅券牆
細甄運土等工



宣統三年八月

十一

日



崇陵地園寢頭段工程報告

代監督 李兆麟 監修 朱開第 代監修 彬 辦事官 沈學昌 謹
退齡 年其沃 李廷瑞 鄭寶賢

稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自八月初一日至
初五日據各廠具報除初二日因雨挂兑一日外進匠四天其
工作情形臚列於後理合稟

聞謹

稟

東昇廠呈報

左寶頂軌券後月牙牆乾擺澄漿停城軌背後成砌新樣城
軌灌漿已齊現築打背後灰土

成砌券仔隧道象眼牆現乾擺澄漿停城軌背後成砌新
樣城軌並金剛牆成砌新樣城軌灌漿築打背後灰土及鑿

打石料等工

興隆廠呈報

右寶頂軌券內紮縛券仔繒梁桁條樁柱已齊紮拴荆笆
一層苫青灰背二層已齊背後築打大夯碼灰土六步至
十六步已齊

隧道並金剛牆背後均築打大夯碼灰土第一步並鑿

打龍鬚溝及青白石溝漏溝底蓋石料等工

聚興永天利天和天順等廠合報均成砌羅券牆下
肩細乾擺澄漿城軌並砍磨細軌運土等工

宣統三年八月初六日





崇陵地園寢頭段工程報告

監督延鴻代監督

張光昭
李兆麟
李廷瑞

監修廷順代監修李廷瑞辦事官李應鈞
李殿卿

稟所有恭修

妃園寢頭段工程監督等在工逐日監視一切現自七月二十六日至二

十九日據各廠呈報所進匠夫工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂軌券平水牆乾擺澄漿城軌背後灰砌新樣城軌灌漿

已齊北面月牙牆現乾擺澄漿城軌背後灰砌新樣城軌灌

漿並鑿打石料等工

興隆廠呈報



右寶頂軌券平水牆乾擺澄漿城軌三順一丁高二十一層均齊隨灰

砌背後新樣城軌灌漿已齊北面月牙牆乾擺澄漿城軌隨灰砌

背後新樣城軌灌漿已齊券內扎拴券仔扎縛頂樁柱桁條縉

梁券外築打背後大券碼灰土第三步已齊現在築打第四步

隧道金剛牆灰砌隨式城軌計四進高九層已齊現砌第十層象

眼牆安砌乾擺澄漿城軌三順一丁隨砌背後隨式城軌灌漿並

鑿打石料等工

聚興永天利天和天順等廠合報均成砌

羅券牆下肩細乾擺澄漿城軌並砍磨細軌運土等工



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督將式理代監督張光熙監修廷順代監修李廷瑞辦事官李淑鈞李綬等謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程監督等在工逐日監視一切現自七月二十一日至二十五日除因雨掛兌一日外據各廠呈報四天所進匠夫工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券平水牆觀脚成砌新樣城甄灌漿已齊現干擺澄漿停城甄背後成砌新樣城甄灌漿並鑿打石料等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券平水牆成砌干擺灌漿現砌第十七層已齊隨砌背後新樣城甄灌漿鑿打龍鬚溝並溝漏等工

聚興永天順天和天利等廠合報成砌

羅券牆下肩細干擺澄漿城甄並砍磨細甄運土等工

宣統三年 七月 二十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 張光熙 李兆麟 李廷瑞 李應鏞 李淑鈞 李淑卿 監修 廷順代監修 李廷瑞辦事官 李應鏞 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視一切現自七月十六日上
工起至二十日據各廠呈報所進匠夫工作詳細情形開列於
後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甎券背底成砌新樣城甎灌漿已齊現平水
牆觀脚成砌新樣城甎並整打石料等工

興隆廠呈報

右寶頂甎券平水牆背底灰砌新樣城甎已齊觀脚

已齊現砌平水牆干擺灌漿等工

聚興永天利天和天順等廠合報均成砌

羅券牆下肩細干擺澄漿城甎並砍磨細甎運土
等工



宣統三年七月二十一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 李兆麟 監修 朱綸 代監修 李廷瑞 辦事官 康躍門 謹
李綬卿

票所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工監視一切現自六月二十日至二十五日除挂免三日外據各廠呈報進匠兩天其工作情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券平水牆背底成砌新樣城甄等工

聚興永天利天和天順等廠合報均成砌

羅券牆下肩細乾擺澄漿城甄並砍磨細甄運土等工





崇陵妃園寢頭段工程報告

監督延鴻 監修 永順 朱開寶 代監修李廷瑞辦事官 鄭寶賢
代監督遊齡 年其汶 監修 朱開寶 代監修李廷瑞辦事官 沈學昌 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程 監督等在工逐日監視一切現自六月十一日至十六日據各廠具報除十一日因雨挂兌外進匠夫四天其工作情形臚列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄春大墼築打大春碣灰土七步已齊現在整打石料
砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄春築打大春碣灰土第五第六步均齊現築打第七步
七步隧道分位築打大春碣灰土第四步已齊現築打第五步
並整打石料砍磨細甄等工

聚興永天利天和天順等廠合報均成砌羅春牆下
肩細乾擺澄漿城磚並砍磨細甄運土等工

宣統三年六月十六日



崇陵地質段工程報告

監督延鴻 監修 永延 順
代監督遜齡 朱開寶 順 代監修李廷瑞辦事官鄭寶賢謹
年其注

稟所有恭修

妃園寢頭段工程 監督 等在工逐日監視一切現自六月初六日至

初十日據各廠具報進匠夫五天其工作情形臚列於後理合

稟聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券大槽內現築第五步第六步第七步灰土已齊並整

打石料砍磨細甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券隧道分位龍鬚溝底蓋安砌均齊隨砌背後新樣城

甄灌漿接築打大夯碼加細灰土第四步並整打石料砍磨細
甄等工

聚興永天利天和天順等廠合報成砌羅券牆線整鏟除

草皮並成砌牆下肩細乾擺澄漿城甄砍磨細甄運土等

工



宣統三年六月十一日



崇陵地園寢頭綫工程報告

代監督避齡監修延順永開年其李廷瑞辦事官鄭寶賢謹稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切自六月初一日至初五日據

各廠呈報進匠夫五天所做活計臚列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券大墻內龍鬚溝成砌背後新樣城甃灌漿已齊現築打第四步灰土已齊接築第五步灰土並鑿打石料砍磨

細甃等工

興隆廠呈報

右寶頂甃券隧道分位龍鬚溝安砌溝底已齊現安溝蓋隨砌

背後新樣城甃並鑿打石料砍磨細甃等工

聚興永天和天順天利等廠合報均砍磨細甃運土等工



宣統三年六月初六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督遐齡監修周光榮代監督李廷瑞辦事官呂應鏞謹稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自五月二十六日至二十九

日除因雨停工二日外據各廠呈報所進匠夫工作詳細情形開列於

後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂磚券大墻內龍鬚溝安溝底溝蓋石料已齊現成砌背後新

樣城磚灌漿並整打石料砍磨細磚

興隆廠呈報

右寶頂磚券大墻內龍鬚溝安砌溝底隨砌背後新樣城磚灌漿



並砍磨細磚

聚興永利天和天順等廠合報均砍磨細磚運土

等工

宣統三年六月初一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 姚福同 監修 周光榮 代監督 李廷瑞 辦事官 李淑鈞 李應鑄 謹
選齡 廷順

稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視一切現自五月二十一日至二十五日據各廠呈報所進匠夫工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券大墻內龍鬚溝現安溝底並砍磨細甃鑿打石料

興隆廠呈報



右寶頂甃券大墻內龍鬚溝現安溝底

琉璃門面潤牆下龍鬚溝上面築打灰土第八第九步已齊

宮門面潤牆下龍鬚溝上面築打灰土第二步已齊

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨細甃運土等工

宣統三年五月二十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 李兆麟 監修 周光榮 辦事官 李淑鈞 謹
廷齡 監修 聶憲 代監督 李廷瑞 辦事官 呂應鑄 謹
廷順 稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督 等在工逐日監視一切現自五月十六日
至二十日據各廠呈報所進匠夫工作詳細情形開列於
後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券大增內抬運龍鬚溝石料砍磨細甄鑿打石料

興隆廠呈報

右寶頂甄券砍磨細甄



琉璃門東面潤牆下龍鬚溝上面築打大夯灰土第七步
已齊現打第八步

宮門東面潤牆下龍鬚溝溝蓋隨砌背後甄並背後灰土五
步均齊現築龍鬚溝上面第一步灰土

聚興永天利天和天順等廠均合報砍磨細甄運土各工

宣統三年五月二十一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

監 督蔣式理 監修 廷 順 代監修 李廷瑞 辦事官 查富璣 謹
代監督 遜 齡 年 其 代監修 路廣壽 方寶廉 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程 監督等在工逐日監視一切現自五月十一日
至十五日據各廠具報進匠五天所做活計臚列於後
理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券大墻內現抬運龍鬚溝石料砍磨細甃鑿打

石料

興隆廠呈報



右寶頂甃券砍磨細甃

琉璃門面潤牆下龍鬚溝現築背後灰土五步均齊

宮門面潤牆下龍鬚溝溝底砌背後甃已齊現安溝蓋

聚興永天和天利天順等廠合報均砍磨細甃運

土各工

宣統三年五月十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督馮煜
遜齡 監修 年其汶
順代監修 路慶壽
李廷瑞 辦事官 方寶廉
查富機 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自五月初六日至初十日據各廠商具報進匠五天所做活計臚列於後理合稟聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甎券砍磨細甎鑿打石料

宮門東面闊牆泊岸下龍鬚溝上面築打第二步灰土已齊

興隆廠呈報

右寶頂甎券砍磨細甎鑿打石料

琉璃門面闊牆下龍鬚溝底蓋均齊隨砌背後新樣甎

宮門面闊牆下龍鬚溝現安溝底

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨細甎運土等工



宣統三年五月十一

日



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督延鴻代監督遐齡監修年其父順代監修路廣壽辦事官方寶廉謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程監督等在工逐日監視一切現自五月初一日至初
五日除因節停工一日外據各廠呈報進匠四天其詳細情形
臚列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甃券現在砍磨細甃並鑿打石料

琉璃門東面闊牆泊岸下龍鬚溝上面築打灰土九步已齊

宮門東面闊牆泊岸下龍鬚溝墻內灰砌背後新樣城甃灌

漿已齊背後築打灰土五步已齊龍鬚溝上面現築打灰土

興隆廠呈報

右寶頂甃券現在砍磨細甃並鑿打石料

琉璃門西面闊牆泊岸下龍鬚溝安砌溝底灰砌背後新樣
城甃各四進三層已齊

聚興承天利天和天順等廠合報均砍磨細甃運土等工

宣統三年五月

初六

日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 張光熙 彭光源 監修 李廷瑞 辦事官 沈承俊 李綬 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自四月二十六日
至二十九日據各廠商具報所進匠夫工作詳細情形開列
於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂磚券砍磨細磚並鑿打石料

琉璃門東面闊牆泊岸下龍鬚溝槽內安溝蓋石已齊現成

砌背後新樣城磚六層灌漿現築打背後灰土已齊

宮門東面闊牆泊岸下龍鬚溝槽內安溝蓋石已齊現成砌背

後新樣城磚灌漿現築打背後灰土

興隆廠呈報

右寶頂磚券砍磨細磚並鑿打石料

琉璃門西面闊牆泊岸下龍鬚溝現安溝底石

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨細甃運土等工

宣統三年五月初一日



金陵地園版頭段工程報告

代監督遊藝監修崇源彭光瑩代監修李廷瑞辦事官方寶廉謹
沈承俊

稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自四月二十日
至二十五日據各廠商具報所進匠夫工作詳細情形開列
於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報



左寶頂甃券並琉璃門東面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內安溝
底石已齊現成砌背後新樣城甃三層灌漿現築打背後第二

步灰土已齊

宮門東面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內安溝底石已齊現成砌背
後新樣城甃灌漿並墜打石料砍磨細甃

興隆廠呈報

右寶頂甃券砍磨細甃並墜打石料

琉璃門西面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內現已成搭運料躉盤

架子

聚興永天利天和天順等廠合報均砍磨細甃運土等工



崇陵祀園復原段工程報告

代監督 姚福同 監修 彭光瑩 順代監修 李廷瑞 辦事官 沈承俊 方寶廉 李綬 腳 謹

稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視一切現自四月十六日至二

十日據各廠商具報所進匠夫工作詳細情形開列於後理

合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券並琉璃門東面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內

現安溝底石料



宮門東面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內築打第三步灰土

並鑿打石料砍磨細甄

興隆廠呈報

右寶頂甄券並宮門西面潤牆泊岸下龍鬚溝槽內築打

第三步灰土並砍磨細甄鑿打石料

聚興永天和天順天利等廠合報均砍磨細甄運土

等工



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督 李兆麟 監修 趙鶴齡 代監督 李廷瑞 辦事官 方寶廉 呂應鏞 謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自四月十一日至十

五日據各廠商具報進匠五天其詳細情形臚列於後理合稟
聞謹

稟

計開

東昇殿呈報

左寶頂甃券牆內應築打大夯碓灰土七步現已築打三步應
安龍鬚溝石料後再行接築打第四步灰土刻因石匠停
工不能築打灰土



琉璃門東面潤牆泊岸下龍鬚溝牆內築打大夯碓灰土已齊
因石匠停工未能安設龍鬚溝石料
興隆殿呈報

右寶頂甃券牆內應築打大夯碓灰土七步現已築打三步應安設
龍鬚溝石料後再接築打第四步灰土刻因石匠停工不能築
打灰土

琉璃門西面潤牆泊岸下龍鬚溝牆內築打大夯碓灰土三步
已齊因石匠停工未能安設龍鬚溝石料

聚興永天和天順天利等廠合報均砍磨細甃運土等工



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督蔣式理 齡 監修 趙鶴齡 順 代監督 李廷瑞 辦事官 方寶廉 謹
呂應鏞

稟所有恭修

妃園寢頭段工程 監督 等在工逐日監視一切現自四月初六日

至初十日據各廠商具報進匠五天其詳細情形臚列於

後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂磚券並琉璃門東面閣牆泊岸下龍鬚溝分位築

打大夯礮灰土三步

興隆廠呈報

右寶頂磚券並琉璃門西面閣牆泊岸下龍鬚溝分位現

築打大夯礮灰土三步

聚興永天和天順天利等廠均分別砍磨細磚運

土等工



宣統三年四月十一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督馮恕趙鶴齡
監修李廷瑞辦事官方寶廉
呂應鏞謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自四月初一日起至初五日據各廠商具報進匠五天其詳細情形理合開單稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報現在築打

左寶頂磚券墻內大夯碼灰土並砍磨細磚等工
興隆廠呈報現在築打

右寶頂磚券墻內大夯碼灰土並砍磨細磚等工
聚興永天和天利天順等廠均呈報砍磨

羅券牆細磚運土



宣統三年四月初六日



崇陵妃園寢頭段工程現做情形報告摺

監督延鴻 監修廷 順代監修 李廷瑞 啟隆
代監督退齡 聶憲藩 榮源 辦事官 康瑞 謹稟所有恭修
妃園寢頭段工程 監督 等逐日在工監視茲查自三月二十六日起至三十日
五天所進匠夫工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠現做砍磨

左寶頂磚券細磚築打槽內大夯碼灰土

興隆廠現做砍磨

右寶頂磚券細磚築打槽內大夯碼灰土並

龍鬚溝分位剗增運土

聚興永天和天利天順等各廠現亦各做砍磨

羅券牆細磚並運土



宣統三年四月初一日



崇陵地園寢頭段工程現做情形報告

代監督 張光焘 監修 廷順 代監修 李廷瑞 辦事官 康躍門 謹
馮憲藩 稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等逐日在工監視茲查自三月二十一起至二
十五日五天所進匠夫工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠現做鑿打

左寶頂龍鬚溝石料砍磨鞞券細鞞並築打墻內大夯碼灰土

興隆廠現亦做鑿打

右寶頂龍鬚溝石料砍磨鞞券細鞞亦築打墻內大夯碼灰土

聚興永天和天利天順等廠現亦各做砍磨

羅券牆細磚並運土



宣統三年三月二十六日



崇陵妃園寢頭段工程現做情形報告

代監督退齡監修廷順代監修李廷瑞辦事官康隆謹
鼎憲藩榮源查富機

稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等逐日在工監視茲查自三月十六日起至二十日五天內除十六日因雨挂兌外其進匠夫四天工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠現做鑿打

左寶頂龍鬚溝石料砍磨軌券細軌並拌灰土

興隆廠現亦做鑿打

右寶頂龍鬚溝石料砍磨軌券細軌並築打大分碼灰土

聚興永天和天利天順等廠現亦各做砍磨

羅券牆細軌並運土



宣統三年三月

二十一

日



崇陵地園寢頭段工程報告

代監督姚福同監修朱閣第李廷瑞辦事官鄭寶賢謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視工作現自三月十一日至十
五日據各廠商具報進匠五天其詳細情形理合開單稟
聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂軌券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細軌等工

興隆廠呈報

右寶頂軌券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細軌等工

聚興永天和天順天利等廠合報均分別鑿打石料

砍磨細軌等工



宣統三年三月十六日



崇陵地園寢頭段工程報告

代監督 李兆麟 監修 朱開第
退齡 順代監督李廷瑞辦事官鄭寶賢謹
年其汶

稟所有恭修

妃園寢頭段工程 代監督 等在工逐日監視工作現自三月初六

日至初十日據各廠商具報進匠五天其詳細情形理
合開單稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂執券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細執等工

興隆廠呈報

右寶頂執券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細執等工

聚興永天和天順天利等廠合報均分別鑿打石
料砍磨細執等工



宣統三年三月

十一

日



金陵 如園 癸卯 頭段 工程 報告

代監督選齡監修朱綸順代監修李廷瑞辦事官李淑鈞謹稟
周光榮 呂應編 查富璣

所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等逐日在工監視茲查自二月二十六日至二十九日小建四天內除二十九日因雨掛兌外具進匠夫三天工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

詳開

東昇廠現做砍磨

左寶頂執券細執鑿打龍鬚溝石料各工

興隆廠現亦做砍磨

右寶頂執券細執鑿打龍鬚溝石料各工

天和天順聚興永利等廠現亦各做砍磨

羅券牆細執並運土





崇陵地園窆頭段感視工做第二十八次報告

監督蔣式瑔代監督永興監修永興李廷瑞辦事官鄭寶賢謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程監督等在工逐日監視一切現自三月初一日至初五日據各廠商具報進匠五天其詳細情形開列於後理

合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂軌券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細軌等工

興隆廠呈報

右寶頂軌券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細軌等工

聚興永天和天順天利等廠合報分別鑿打石料砍磨細軌等工

三月初六日





崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督馮恕
周光榮
代監督李廷瑞辦事官李應鑄
李淑鈞
謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等逐日在工監視茲查自二月二十一日至二十五日五天內除二十一日因雪挂兌外其進匠夫四天工作詳細情形開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠現砍磨

左寶頂甄卷細甄鑿打龍鬚溝石料各工

興隆廠現亦砍磨

右寶頂甄卷細甄鑿打龍鬚溝石料各工

天和天順聚興永天利等廠現亦各砍磨

羅卷牆細甄並運土



宣統三年二月二十六日



崇陵妃園寢頭段工程報告

監督延鴻代監督遊齡監修朱綸順代監修李廷瑞辦事官李淑鈞謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程監督等逐日在工監視茲查自二月十六日至二十日
五天內除十六十八兩天因雪挂免外其進匠夫三天詳細情形
開列於後理合稟

聞謹

稟

計開

東昇廠現砍磨

左寶頂甄券細甄鑿打龍鬚溝石料各工

興隆廠現亦砍磨

右寶頂甄券細甄鑿打龍鬚溝石料各工

天和天順聚興永天利等廠現亦各鑿打石料砍磨細甄運土



宣統三年二月

二十一日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督退齡監修順劉錦藻其代監修路廣壽李廷瑞辦事官查富璣方寶廉謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自二月初六日至初十日據各廠商具報進匠五天詳細情形理合開單稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細甄等工
興隆廠呈報

右寶頂甄券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細甄等工
天順天利天和聚興永等廠均呈報分別鑿打石料砍磨細甄等工



宣統

三年

二月

初十

日



崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督

姚福同

監修

年其汝

劉錦藻

辦事官

查富璣

李廷瑞

代監督

李廷瑞

辦事官

方寶廉

謹

稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自二月

初一日至初五日據各廠商具報進匠五天詳細

情形理合開單稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細

甄等工

興隆廠呈報

右寶頂甄券分位現鑿打龍鬚溝石料砍磨細

甄等工

天順天利天和聚興永等廠均呈報分

別鑿打石料砍磨細甄等工

宣統三年

二月

初六

日





崇陵妃園寢頭段工程報告

代監督遊齡監修廷順
年其文代監修李廷瑞謹
稟所有恭修

妃園寢頭段工程代監督等在工逐日監視一切現自正月二十
六日至三十日各廠商具報進匠五天詳細情形理合
開單稟

聞謹

稟

計開

東昇廠呈報

左寶頂甄券現在砍磨細甄

興隆廠呈報

右寶頂甄券現在鑿打龍鬚溝砍磨細甄並拉運甄

石等料



宣統三年正月 三十 日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督遜齡監修 廷順 彭光瑩 年其汶 代監修李廷瑞謹

稟所有廠商恭修

妃園寢工程 代監督 等在工逐日監視一切現自正月二十
一至二十五日五天東昇等廠報進匠砍磨細甄
興隆廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甄等工
並拉運甄石料理合稟

聞謹 稟



宣統三年正月 二十五 日



崇陵妃園寢工程頭段報告

代監督選齡監修年其汝順辦事官李廷瑞謹

稟所有廠商恭修

妃園寢工程代監督等在工逐日監視一切現自十二月十六日

至二十日五天東昇廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨

細甄等工興隆廠報進匠鑿打龍鬚溝砍磨細甄

並拉運甄石等等料理合稟

聞謹

稟

