

# 第十一冊 頭身一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其文 廷順 辦事官 榮源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處墻底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大墻頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大墻頭段灰土進頭二三七券二十六墻築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大墻頭段灰土進小券八墻加倍充剝行礪一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本  
卷 冊十一  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 貴重-71  
編號 BX9000600

[彩色首頁1](#)  
[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)  
[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)  
[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)  
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所  
[使用上的注意事項](#)

第一次報告

卷號



第 冊  
東方文化學院東京研究所  
No. 4851

由書百九柴至貳百貳九號共三十三件



別 置  
甲 71



工字第陸拾叁號

妃園寢工程第五次報告





監督汪鴻督汪鴻監督戴光監修汪光辦事官汪光

謹將廠商具報三月十一至二十五日共修

妃園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列

開單恭呈

鈞鑒

詳開

現抄平子過中

碼如線墩

成搭園廠

以上東昇興隆聚興天利天和天順等廠並各廠恭修



宣統元年三月

子五

日





崇陵工程第六次報告

工字第陸拾伍號



監督李焜瀛幫監督聯堃李兆麟堃監修楊懿年李統芬年辦事官徐英房義矩英謹

將廠商具報三月十六至二十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開

單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆東道泊岸分位起創地基

東面羅券牆泊岸起創石渣山塹打山石

碼砌線塹

成搭圈廠

開挖引河



以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

起創石渣山塹打山石

開挖引河

碼砌線塹

成搭圈廠

以上二段興隆東昇德祥祥和德利藝和聚源等廠恭修

開挖引河

碼砌線塹

成搭圈廠

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

監督李焜瀛幫監督聯鑿李兆麟光監修李楊李鏡芬年辦事官徐英屠我矩謹

將廠商具報三月十六至二十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開

單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆史道泊岸分位起創地基

東面羅券牆泊岸起創石渣山塹打山石

碼砌線塹

成搭圈廠

開挖引河

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

起創石渣山塹打山石

開挖引河

碼砌線塹

成搭圈廠

以上二段興隆東昇德祥和德利藝和聚源

等廠恭修

開挖引河

碼砌線塹

成搭圈廠

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修



以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

平墊地基

碼砌線墻

成搭圈廠

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修

宣統元年三月

二十

日



工字第陸拾肆號

妃園寢工程第六次報告





監督李煜瀛幫監督聯李北麟監修楊慈年辦事官徐英義謹

將廠商具報三月十六至二十日恭修

妃園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚

列開單恭呈

鈞鑒

詳開

現抄平子過中線

碼砌線墩

成搭圈廠

以上興隆東昇天利聚興天順天和中美

萬豐藝和等廠並各廠恭修



宣統元年三月

二十

日



崇陵工程第七次報告

工字第陸拾陸號



幫監督

載光 李麟 英聯 後

監修

祝元 張志 李毓 崇福 楊年

辦事官

孫寶 潘元 方寶 趙從 英廉 廖義 矩

謹將廠商

具報三月二十一日至二十五日內除二十四日因雨停工外所有四日恭修

崇陵工程詳細情形幫監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆更道泊岸分位起創地基

東西羅券牆泊岸起創石渣山整打山石

開挖引河

碼砌線墩

成搭圈廠

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

起創石渣山整打山石

開挖引河

碼砌線墩

成搭圈廠

以上三段興隆東昇德祥祥和德利藝和聚源等廠恭修

開挖引河

碼砌線墩

成搭圈廠

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河



開挖引河

平整地基

碼砌線墩

成搭圈廠

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修







妃園寢工程第七次報告

工字第陸拾柒號

幫監督

載光 李兆麟 李英 李俊

監修

祝瀛元 姚福榮 李毓恭 李毓年

辦事官

孫寶瑄 孔繁裕 徐寶慶 英 趙從善 屠義矩

謹將廠商具

報三月二十一日至二十五日內除二十四日因雨停工外所有四日恭修

妃園寢工程詳細情形幫監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂分位起創地基

現抄平子過中

碼砌線墩

成搭圈廠

以上興隆東昇天和天利聚興天順藝和天和萬豐天泉中義

賓興等廠恭修





崇陵工程第八次報告

工字第陸拾捌號



監督將式理幫監督戴光 李兆麟 英俊 監修姚福同 張志潛 朱開第 楊懿年 辦事官方寶康 潘元權 孔繁裕 英眉 義矩 謹將  
廠商具報三月二十六日至二十九日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆更道泊岸分位起創地基

東面羅券牆泊岸起創石渣山墾打山石

開挖引河

碼砌線整

成搭圈廠

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

起創石渣山墾打山石

開挖引河

碼砌線整

成搭圈廠

以上二段興隆東昇德祥祥和德利藝和聚源等廠恭修

開挖引河

碼砌線整

成搭圈廠

以上三段天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河


開挖引河

平墊地基

碼砌線墼

成搭圈廠

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修

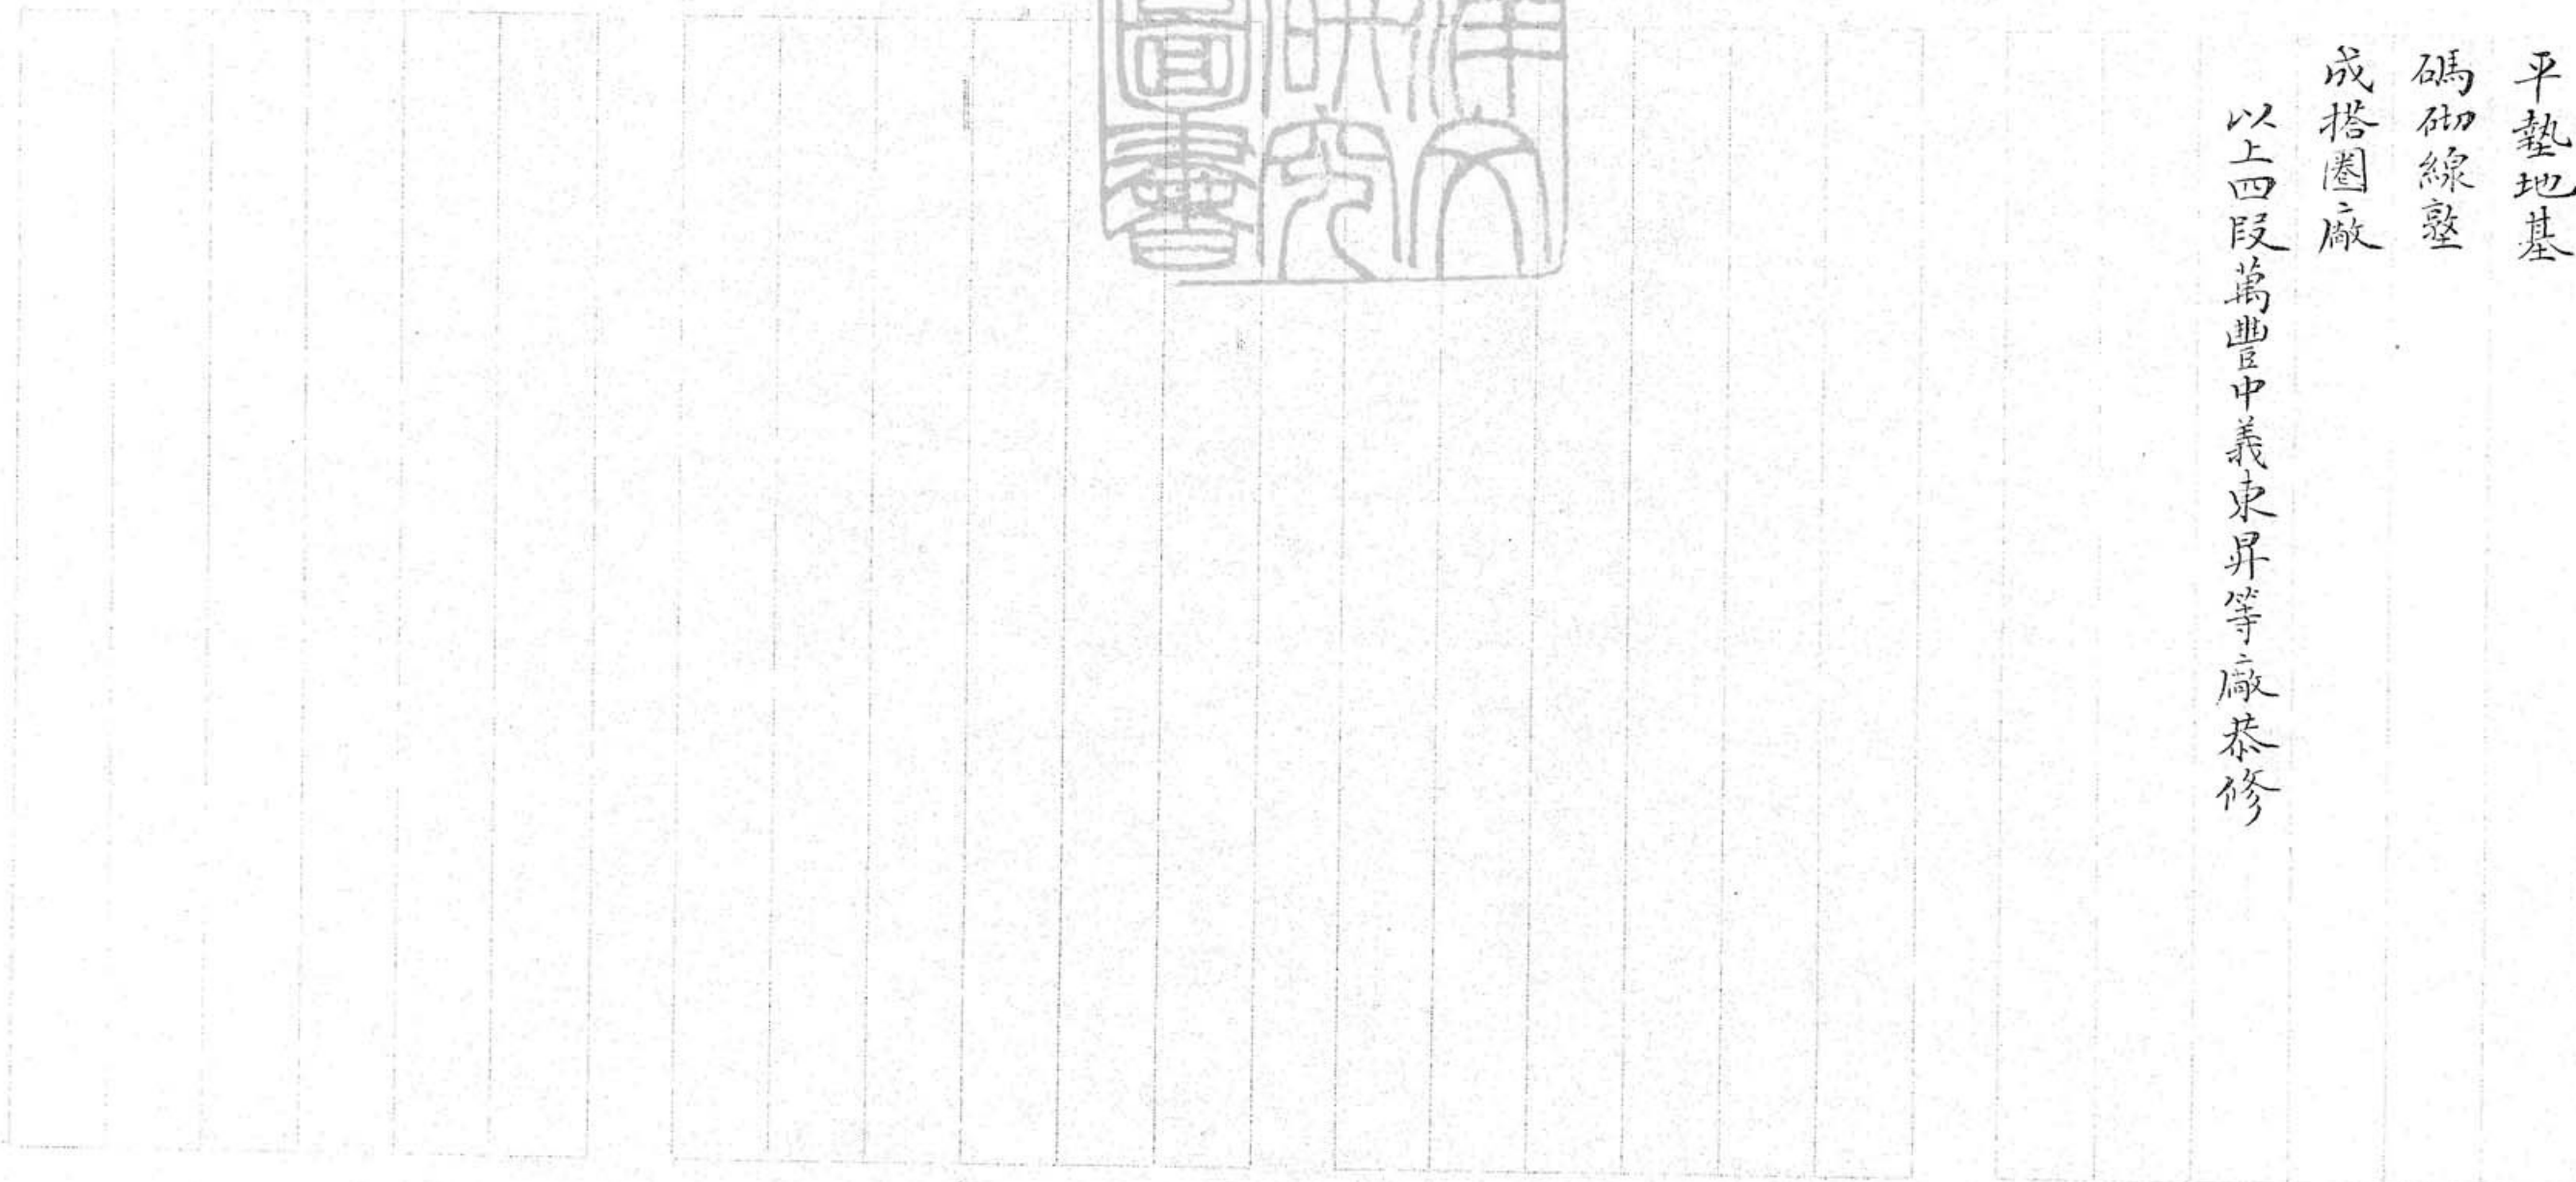



妃園寢工程第八次報告

工字第陸拾玖



監督將式理幫監督載光 李兆麟 英俊監修姚福同 張志潛 朱開第 楊崇年辦事官方寶廉 潘元耀 孔繁裕 廣益 徐英 廣義 姪謹將

廠商具報三月二十六日至二十九日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈  
鈞鑒

計開

兩寶頂分位起創地基

現抄平子過中

碼砌線整

成搭圈廠

以上興隆東昇天和天利聚興天順藝和天和萬豐天泉  
中義賓興等廠恭修





崇陵工程第九次報告

工字第 柒拾 號

監督紹興 楊壽拱 鴻勳楊壽拱 監督楊壽拱 畢瞻楊壽拱 監修楊壽拱 李寶誌楊壽拱 辦事官楊壽拱 謹將

廠商具報四月初一日至初五日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆更道泊岸分位起創地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

起創石渣山鑿打山石

開挖引河

碼砌線整

現抄平子過中線

以上二段興隆東昇德祥藝和祥和德利聚源等廠恭修

開挖引河

鏟除草皮

碼砌線整

以上三段興隆天和賓興天和等廠恭修

開挖引河

鏟除草皮

平墊地基

碼砌線整

現抄平子過中線





以上四段萬豐中義東昇等做恭修





花園寢工程第九次報告

工字第柒拾壹號







崇陵工程第十次報告

工字第柒拾貳號

監督 紹 舞 楊壽耕 幫監督田步蟾 年其汶 楊壽耕 監修李寶詒 年其汶 楊壽耕 辦事官 李廷瑞 楊壽耕 謹將

廠商具報四月初六日起至初十日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位剝挖大增出運石渣土

羅春牆更道泊岸分位起剝地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段工程興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

起剝石渣山鑿打山石

開挖引河

碼砌線整

以上二段工程興隆東昇德祥和德利藝和聚源等廠恭修

開挖引河

鏟除草皮

碼砌線整

以上三段工程天和興隆天和賓興等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水壩地基打樁築堤

鏟除草皮

平墊地基



馬砌線整

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修







妃園寢工程第十次報告

工字第柒拾叁號

監督紹 彝 鴻幫監督田步蟾楊壽祺 監修年其文 幫監督李寶詒李銳中 辦事官尚文 蔡國器 謹 將

廠商具報四月初六日起至初十日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂分位起釧地基

現抄平子過中

碼砌線墪

以上中義萬豐藝和聚興天和興隆東昇天利天順天和  
天泉賓興等廠恭修





崇陵工程第十一次報告

工字第拾肆號





平墊地基

碼砌線整

以上四段工程萬豐中義東昇等廠恭修





妃園寢工程第十一次報告

工字第柒拾伍號







崇陵工程第三次報告

工字第柒拾陸號

監督 陳崇煒 幫辦 馮恕 監修 彭光堂 劉錫疇 周德華 督辦 錫珍 辦事官 方寶廉 張志設

吳啟修 監修 武燕 監修 銓未 監修 林翰 監修 楊懿年 監修 趙啟華 監修 徐世同 監修

將廠商具報四月十六日至二十日內除十九日因雨停工外所有言恭修

崇陵工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位剷挖大墻出運石渣土

羅券墻更道泊岸分位剷挖地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

隆恩殿剷地地基

起剷石渣山墜打山石

開挖引河

碼砌線整

以上三段藝和興隆德祥和德利東昇聚源等廠恭修

開挖引河

成搭浮橋

碼砌線整

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水霸地基打樁築堤

鏟除草皮





迎水霸地基打樁築堤  
鏟除草皮

平墊地基

碼砌線墜

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





妃園寢工程第十二次報告

五字號 柒拾柒號



妃園寢工程第十二次報告

工字第柒拾柒號







崇陵工程第十三次報告

工字第柒拾捌號






迎水壩地基打樁築堤  
成搭三孔浮橋

平墊地基  
碼砌線墊

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





妃園寢工程第十三次報告

工字第柒拾玖號







崇陵工程第十四次報告

工字第捌拾號

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

監督延鴻幫監督戴燕英俊監修劉錫壽

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位剝挖大槽出運石渣土

羅券牆更道泊岸分位起剝地基

開挖引河

碼砌線壑

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

隆恩殿起剝地基壑打山石

起剝石渣山壑打山石

開挖東北來水引河隨成搭三孔浮橋二座

碼砌線壑

以上二段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源等廠

恭修

開挖引河

成搭浮橋

碼砌線壑

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水壩地基打樁築堤

迎水壩地基打樁算場

成搭三孔浮橋二座

平墊地基

碼頭線墊

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修







女園寢工程第十四次報告

工字第捌拾壹號





崇陵工程第十五次報告

工字第捌拾貳號



將督廠商具報五月初日至初五內除初五日因午節放三日外  
所有四日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位創挖大槽出運石渣土

羅券牆更道泊岸分位起創地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線



隆恩殿起創地基整打山石

起創石渣山整打山石

開挖東北來水引河隨成搭三孔浮橋二座

碼砌線整

以上二段藝和興隆德祥和德利東昇聚源等廠恭修

開挖引河

成搭浮橋

碼砌線整

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水壩地基打樁築堤

開挖引河

迎水壩地基打樁築堤

成搭三孔浮橋二座

平墊地基

碼頭線整

以上段萬豐中義東昇等廠恭修





花園寢工程第十五次報告

工字第捌拾叁號



幫監督戴兆麟監修謝順光封帛監修崇愛辦事官屠長能  
李兆麟監修楊光顯封帛監修陳文會辦事官郭廷瑞  
蔡國器辦事官蔡國器辦事官蔡國器辦事官蔡國器  
將廠商具報五月初一日至初五日內除初五日因午節放工一日外  
所有四日恭修

妃園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈  
鈞鑒

計開

兩寶頂分位起創地基

羅券牆分位起創地基

現抄平子過中

碼砌線墩

以上中義天泉藝和興隆聚興賓興萬豐東昇天  
順天利天和天和等廠並各廠恭修





崇陵工程第十六次報告

五字第捌拾肆號

監督紹 李兆麟 監修 楊繼年 督辦 榮受 辦事官 李廷 謹

將廠商具報五月初六日至初十日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位刨挖大墁出運石渣土

羅券牆更道泊岸分位起刨地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

隆恩殿起刨地基墊打山石

起刨石渣山鑿打山石

開挖東北來水引河隨成搭三孔浮橋二座

碼砌線整

以上二段藝和興隆德祥祥和德利東昇聚源等廠

恭修

開挖引河

成搭浮橋

碼砌線整

以上三段寶興興隆天和天和等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水壩地基打樁築堤



開挖引河


迎水壩地基打樁築堤

成搭三孔浮橋二座

平墊地基

碼砌線整

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





地圖院工程第十六次報告

五字第捌拾伍號

監督紹興幫監督李兆麟監修楊鈞幫監督崇監修陳文會監修蔡國器謹

將廠商具報五月初六日至初十日恭修

如園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂分位起創地基

羅券牆分位起創地基

現抄平子過中

碼砌線整

以上中義天泉藝和興隆聚興賓興萬豐東昇  
天順天利天和天和等廠並各廠恭修







崇陵工程第十七次報告

工字第捌拾陸號

監督 蔣武理 林景賢 幫監督 田安瞻 楊鏡年 監修 順光 崇史 郭家聲 李廷瑞 辦事官 陳文會 屠義址 謹

將廠商具報五月十一日至十五日恭修

崇陵工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城並地宮各券分位創挖大槽出運石渣土

羅券牆更道泊岸分位起創地基

開挖引河

碼砌線整

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

現抄平子過中線

隆恩殿起創地基整打山石

起創石渣山整打山石

開挖東北來水引河隨成搭三孔浮橋二座

碼砌線整

以上二段藝和興隆德祥和德利東昇聚源等廠恭修

開挖引河

成搭浮橋

碼砌線整

以上三段廣興興隆天和天和等廠恭修

現抄平子過中線

開挖引河

迎水壩地基行夯築堤

開挖引河

迎水壩地基行夯築堤

成搭三孔浮橋二座

平墊地基

碼砌線壑

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修







如園寢工程第十七次報告

工字第捌拾柒號

監督 蔣式理 林景賢 幫監督 田步蟾 張光 監修 楊懿年 沈 崇 陳文會 辦事官 李瑞 李瑞 延 李瑞

將廠商具報五月十一日至十五日恭修

如園寢工程詳細情形 監督 等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂分位起創地基

羅券牆分位起創地基

現抄平子過中

碼砌線整

以上中義天泉藝和興隆聚興賓興萬豐東昇天  
順天利天和天和等廠並各廠恭修





六

第

安

啓

工字第貳百零玖號

允澤  
械



六弟以見來函均悉堂端  
尚未送畫元意

陵寢規制不可不令廠商一見  
昨已派商人馬文連隨李毓  
前往開叙高姓亦擬派廠

商道往玉於算樣兩房既  
經奉裁總以不露明為妙  
仍不妨令其隨往也元意如  
此處否候酌專復印頌  
特此

光澤印



貝  
勒  
爺  
鈞  
啓

手諭敬悉前者接到

飭旨承修之諭當即轉由工程  
處分傳即可

飭令開工毋付計議並日期甚迫  
擇吉開工不過宜言之誤要旨也  
但有進於

麾下步此工最關緊要不可獨  
任其責庶必何輪派往修路工

交印須

與各官等集商再承

車愛故敢冒昧直言之也查派往

修一節查與諸年吉相同案須將堪輿兩陳方

向叙此次應否先某抑或候四堂赴

陵時仍將採地堪輿携往歸併再查須

酌會此年五後印

節安恕不恭 年京廷啓謹上





貝

勒

斧

鈞

啟

工字第貳百貳肆號

馮怒上

初六日下午六鐘

昨鹿相國回妃園寢土是否尊藏囑章京  
託人向東陵查訊惟所託之人須初十方能  
回京頃聞另一人云山陵吉土及園寢氣土  
將來皆須還原云此次所動妃園寢氣土似  
以暫行收藏俟查有案據再行仿照辦理  
為妥除覆鹿相國外理合上

聞敬請

鈞安

章京怒叩

初六日下午六鐘



貝

勒

爺

爵

啟

工字第貳百貳伍號



敬稟者頃奉

堂諭派充差弁四名應即轉傳遵照辦

理專此稟復恭請

鈞安

章京

李廷瑞

路膺壽 謹稟



謹

封



貝

勒

命

安

稟

工字第貳百貳陸號

差弁張德照敬呈

差弁張德照謹

稟

貝勒爺爵前敬稟者今在右營馬號巡右另有空院一所建蓋  
車棚三間初九日開工十七日上梁二十五日可以工竣謹

此具稟





謹藉復呈

郡王銜貝勒  
翁鈞啟

工字第貳百貳柒號

傅霖肅上

貝勒爺鈞座敬覆者頃奉

手諭擬定二十三日赴工自應遵照惟須當日請

訓即午便乘火車馳往須預令郵傳部計算時刻備車方

可請由

尊處商定

貝子

命兩處飭知郵傳部遵辦 霖當隨同

赴工均於二十七日趕回也商定仍祈

諭知為禱敬請

爵安 傳霖謹肅復上 十七日



第八次報告

正字 參百零陸



監督延鴻代監督識璋光監修廷順朱開第劉學謙林代監修錫珍辦事官李廷瑞陳珩春謹  
田步蟾毓彭楊齡年毓寶趙從蕃滿

將厥商具報自七月十六日起至二十日恭修

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基剷挖山石出運石渣土

方城地基鏟除草皮

羅券牆地基出運渣土

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起剷石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

以上二段藝和興隆祥和德祥德利東昇聚源等廠恭修



隆恩門

東西配殿

東西朝房

進深牆

三路三孔橋各地基均鏟除草皮

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修



第十八次報告

正字 參百零柒

監督延鴻代監督誠璋充監修廷順劉學謙  
田步瞻誠朱開第銓林代監修錫珍辦事官鄭寶方房義  
彭楊誠林代錫珍辦事官鄭寶方房義  
折誠趙從恭泰謹

將廠商具報自七月十六日起至二十日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂地基

羅券牆地基


宮門地基

茶膳餽餽房地基

一孔橋各地基均鏟除草皮

以上中義天泉藝和興隆聚興賓興萬豐東昇天和

天利天順天和等廠並各廠恭修







第十九次報告

五字第叁百零捌號

代監督 避 嶺 載 光 監 修 朱開第 劉學謙  
聯 堽 田 步 蟾 順 銓 林代監修錫珍辦事官  
毓 彭 楊 齡 年 毓 寶 瑞 方 屏 義 矩  
毓 寶 贊 趙 從 藩 謹

崇陵工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基剷挖山石出運石渣土

方城地基鏟除草皮

羅券牆地基出運渣土

馬槽溝地基鏟除草皮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起剷石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德祥和德利東昇聚源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

東西值房

進深牆

大月台

三路三孔橋各地基均鏟除草皮

以上三段賓興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

碑亭

牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





工字第叁百零玖號

第十九次報告



代監督 選齡 戴光 朱開第 劉學謙 聯瑩 田步蟾 監修 延順 銓 林代監修 錫珍 辦事官 毓方 李廷瑞 陳瑞泰 毓彭 楊齡年 毓方 鄭寶賢 趙從蕃 毓方 崇 瀚

將廠商具報七月二十一日至二十五日恭修

妃園寢工程詳細情形 監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂地基

羅券牆地基

大殿地基

宮門地基

茶膳餽餽房地基

一孔橋地基均鏟除草皮

以上興隆東昇天和天利聚興天順藝和天和

萬豐天泉中義賓興等廠並各廠恭修





第二十次報告

工字第叁百壹拾號



監督紹彝代監督遜齡監修朱開第劉學謙  
傅蘭泰英俊順毓彭楊懿年李廷瑞陳壻泰  
林代監修錫珍辦事官鄭寶賢趙從蕃  
謹

將廠商具報七月二十六日至二十九日恭修

崇陵各段工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

寶城地基刨挖山石出運石渣土

方城前蹉躓起刨地基出運渣土

羅券牆地基出運渣土

馬槽溝地基鏟除草皮

以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿地基起刨石渣出運渣土

進深牆分位鏟除草皮

馬槽溝地基鏟除草皮

以上二段藝和興隆德利祥和德祥東昇聚源等廠恭修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房

進深牆

大月台

三路三孔橋各地基均鏟除草皮

以上三段寶興興隆天和天和等廠恭修

碑亭

牌樓門


牌樓門

五孔橋

神厨庫各地基均鏟除草皮

平墊地基

以上四段萬豐中義東昇等廠恭修





第二十次報告

五字第叁百拾壹號



監督紹彝代監督英俊監修朱開第劉學謙  
順銓林代監修錫珍辦事官李廷瑞陳墀泰謹  
辦彭楊懿年辦圻崇滿

將廠商具報七月二十六日至二十九日恭修

妃園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異臚列開單恭呈

鈞鑒

計開

兩寶頂地基

羅卷牆地基

大殿地基

宮門地基

茶膳餽餽房地基

一孔橋地基均鏟除草皮

以上興隆東昇天和天利聚興天順藝和天和萬豐天泉中義

賓興等廠並各廠恭修





蔣監督稟陳墘口之蟄落情形函

貝

勒

爺

鈞

結

工字第肆百肆拾玖號

工程處敬啟



貝勒爺鈞座 式理今日自工次歸 方城地基業經  
續刻深三尺察其土質與三尺之上無異十三日夜間  
方城大槽口之東北角墜落一片約橫三丈有奇豎則  
自槽口直至刻深之處詰問工頭據云恐係密迤大棚  
架小壓力過重所致又云恐係根脚處土質稍軟力不  
能肩重當飭令按照做法再所角從速砌攔土金剛  
牆以保護槽口該高及工頭均以為然允即酌量趕辦  
惟查此種情形<sup>形</sup>根脚處土質稍軟亦係實在情形前  
擬徑不下榜之議恐須再為斟酌 倫貝子明日回京恰  
面時當有耆商量謹預陳私臆以備  
采擇餘容趁印再陳肅此祇請

鈞安 式理謹叩

十六日

再式理擬月杪侍老母回濟誤行有定期再呈請  
賞假謹先陳明





王爺鈞  
子胡

王爺鈞  
子胡

第百捌拾壹

正兩

啟用者奉。會議昭林兩  
監皆據云偏堂務務無為請  
示  
殿下本月赴 陵之否宜准。期如  
之宜准敬啟

示下是偏堂亦擬赴 陵否待定  
期也兩此謹字示印



癸卯年正月十五日



鐵子胡回

王  
壽  
鈞  
啓

柒百捌拾貳

正角十三百



道学

手书教者一切已特语各监替去约  
四纸均可同时进呈惟此时二三西纸者  
未打出须稍等候已飭殿先做样土  
匣子此尔者有而陈之件搬柱以晚间  
恭请

尊府一字不以此恭叩

曾史三章系正序禮上



徽子胡月

王  
奔  
鈞  
啓

工字第 茶百捌拾叁

區兩



敬肅者

諒考案幅况已遠然恭呈

鈞閱惟墨色因年均甚陰澆用  
滑石粉等物拂拭忘皆尋致未後

以如也

鈞駕臨西戶報工及進土枳如喜次預  
備列以表德有豈替一人隨往蓋此時  
正值區役勝佳班也彼意身一人辨枳也

真今日兩邱漆由王公戶口表式呈

閱如善物碍再由宗人府辦理石後  
今晚

公暇吾如概嘗持福而守此印

曹安三章系正德禮上女官





呈

貝

勒

節

鈞

砧

工字第柒百捌拾肆號

竹織

貝勒爺鈞座本日恭修 妃園寢六家廠商呈請  
款以資備料當請以此呈暫無庸遞送日內回  
堂再說查頭紋現只存七千金可否儘數發給  
或遲日再款請  
示遵辦再延奉京昨日已赴 二次矣肅此敬請



鈞安

戈理謹叩 七月初三日



王

爺

鈞

稟

柒百捌拾陸

馮怒謹呈



王爺鈞鑒昨日遵

諭赴良各莊班行至高碑店始知涑  
水橋為山水沖壞不能開車該路總  
辦親帥洋監工前往勘修大約連日  
暢晴亦須二十七方能通行電綫亦  
有阻滯今日已可通報章京當乘晚  
車回京本日已回署當差矣昨晚接  
華軍機 世奎一函送呈

鈞閱如何辦理敬請

傳諭參贊轉告樞司以便遵辦肅此

祇叩

鈞安章京怒叩



繳子胡同

貝

勒

節

鈞

砧

工字號  
茶百捌拾柒



日前邱堂臨行時囑速辦義地預備義材嚴飭彈壓  
事現在撥地事已由筱鵬函催易州義材已飭廠趕緊備辦  
擬定兩連單茲材概照侯刊成印分存各段以便支領彈壓  
一節現又商由本鎮添撥兵丁在工次巡視計共一百二十名分為  
班大致尚可敷用以上各事邱堂甚為注意請即設法商  
以行履系石匠已於昨日照常做工並聞

初二日



頃接延奉京由二次來函照繕呈

覽此上

貝勒爺鈞座 式謹叩 初二日







貝

勒

爺

鈞

啓

工字號  
第百玖拾

工程處  
械

敬肅者現由代監督遊齡等遞來分期  
做法呈經監督等詳加覆核該項做法既  
經廠高在工次與

派出各員詳細商定自屬切實可行監督等  
公同商酌原呈內尚有應行變通之處擬請

堂諭一道附彙呈 閱請

示遵行此上

貝勒爺鈞鑒

武延鴻同叩 十三日



貝

勒

爺

鈞

碇

五

柒百玖拾貳



次接延章京工次未函送呈

鈞閱甫上

貝勒爺鈞鑒

戈謹謹叩

廿八日

昨日電報想已收到石匠工價已議至每日  
工五吊五百粗工五吊漸有頭緒惟因石匠  
要求收回前挂先期內工飯價一併逐日算給  
各廠未允詎意昨晚石匠多人各赴本廠  
備伏收現在做工者即徒力未  
罷工者亦存一鍾鑽等物  
奪去適值此時營兵正在換班未能當時拿獲  
房事與隆工頭聞信即電知京商設法籌辦  
力恐京中傳聞有誤如亦同時電達

尊委今日碑泥本工仍未停止惟石工現已由  
各廠正覓人調製除派趙統領認真彈壓  
並飭工頭從速了結外應再傳廠商切諒速  
籌善法以免曠工久有誤定期盡此敬請  
性父三哥大人 公安

弟學去 廿八日



貝

勒

爺

鈞

鑒

工  
第  
柒  
百  
玖  
拾  
叁

工  
程  
處  
謹  
呈



鈞札敬悉此次度支部撥放本工錢糧叁拾捌萬壹千兩有奇計頭

段應分拾叁萬肆千陸百兩今日面商監督擬放承修

崇陵兩廠拾貳萬壹千兩計連前共領全工拾成肆分九釐有奇

妃園寢陸廠壹萬叁千陸百兩計連前共領全工拾成之叁分玖釐有奇

定於初五日上午發放特此肅

聞敬請

貝勒爺鈞安

段慶昌謹叩

初三日



王

翁

鈞

啓

王字為柒百玖拾伍



王

翁

鈞

啓

王字號柒百玖拾伍



家世上月下旬病痢現已全愈尚未復元起居  
飲食均次調攝十六日輪應武渥駐工次已函  
託筱彭暫代一班俟後補還理合肅

開批清

王爺鈞鑒

武渥謹叩 十六日





微子相白

王

命

鈞

閱

敬肅者今日在工程處辦咨覆度支部  
稿一件冊一本此件關係預算恐於度支部  
將來生有膠葛當由傅監督蘭泰轉商楊  
監修壽枏酌擬表式辦稿若呈

鈞閱時可否

諭令先赴澤公處呈畫抑

晤澤公接洽後再行畫定之處伏請

鈞裁

延鴻謹上 二十三日



謹

職





徽子胡月

王命鈞啓

王命鈞  
茶百玖拾柒



洽此叩

曹安

三年京延修禮止十三日

敬字者昨日廠商來工當收罷工始  
末詳細示知飭其從速了結並議久  
查辦法廠商亦願稍加工價俾早上工但事關  
全局須回京與各廠會商方能決定三年京延修  
即由回京暫由遊薇鵬接班俾日內外分辦以資接

禮

職



王

鉞

鈞

啓

上海圖書館藏



達  
臣奉函一紙呈

閱  
當是未奉本日

電  
前所發也此上

王  
爺  
鈞  
鑒

式  
理  
叩

初九日



此事殆未已焉玉甫乞而陳意多可  
游理及如何語三書憲之書聖與  
玉甫乞就近爾約

示下德心此事猶易維新勢成騎虎  
莫不小德心戒恐非無法也此語

性又三哥之人其安弟序古



恭呈

王

爺

爵

啟

工字號捌百壹



教票者令各工掛免希圖增價但不該  
請聚三千餘人者欲要挾特令毅軍丁管  
帶多方開導人漸解散誰知險詐百端  
埋伏永福寺後俟飯挑送玉皇殿權撥飯  
并不自食掀翻滿地其意以為我等罷  
工而未有者夫依然做法計了得也將飯  
撥一棒令罷始能滿其所以其心可誅幸  
小彭開導上頭屬令在工諸匠設法就  
食以防解體雖有毅軍亦不能放糧不能  
極殺兵亦束手無策情形至此恐具生  
之事萬不可少慎但具奏須回堂朕  
氣總覺完全且占異日地步亦有雷霆不  
足點雨雲在任北有刑威不足補德澤  
缺缺我

王酌三并與各堂議後懇

電示  
北補  
謹呈



恭呈

王爺爵啟

工字第捌百貳



敬稟者此次石匠罷工波瀾橫生詢明情由  
詳為我

王陳之廣豐廠商以米飯待工人三合公櫃欠  
工人錢五百吊<sup>元</sup>遲延不肯為石工罷工之故廣  
豐工頭張正佐懇統領趙個掌人統領未  
商之監禁而遽率兵追匠工先留兵藏山  
窩內單騎去見石工下騎問曰尔何故罷工  
其人不知所對中有數人奮然曰此事可向我  
說我姓作王即以給米飯不給錢為詞趙統  
領曰此事我能辦得到請几位隨我到營內  
商是於是跟去者六人問明即放出二人告曰  
汝可向大衆商議祇要上工便可教換二米飯給  
錢當此四人作質趙統領即赴永福寺以情形告  
延監禁監禁未加可否是日工人聚于解口向營盤  
要人時統領外出天晚工人散趙統領歸又商  
之延監禁仍未說出辦法時監修張介眉暗語  
延監禁回工人罷工趙統領不來知會即去學人  
備一經手惹出大事便是監禁擔承延監禁惑  
其言便以考初不知今到未告我不管為詞趙統  
領無法將所留中人送審判歷餉經保釋此考  
初起事之實在情形也<sup>也</sup>異日工人到工必見延監  
禁監禁問何故罷工人仍執之前詞監禁曰就教  
換飯就教給錢何如工人曰你王皆是苦人多少



說我能作主即以給小米飯不給錢為詞趙統領曰此事我能辦得到請几位隨我到營內商量於是跟去者六人向明即放出二人告曰汝可向大衆商議祇要上工便可放換二米飯給錢當此四人作質趙統領即赴永福寺以情形告延監督延監督未加可否是日工人聚于餅口向營盤要人時統領外出天晚工人散趙統領歸以商延監督仍未說出辦法時延修張介眉暗語一經手意出大事便是延監督擔承延監督惑其言便以考初不知今到未告我不管為詞趙統領無法將所留工人送審判廳解保釋此考而起事之實在情形也異日工人到工須見延監督延監督問何故罷工人仍執前詞延監督曰就教換飯就教給錢何如工人曰你工皆是苦人多少再增些錢工人可作主或立碑或立字據永不罷工若罷法工人罷工之罪此事我承攬得起恐工人作主延督大怒斥曰你配求我說合工人去以此事遂延擱至今邀小彭以兩面相抗於工程大受影響響往見審判廳序允察而謂之曰前工人由尊處放出崗不能置身事外須兩面看之似合不若上無期房今即將保人傳至今其轉波在匠告以利害求增價而罷工固為無罪聚衆一事是則罪之大者匠人聞之深以為懼即與工人商議求和



平了結刻正磋商亦其增價後亦不罷工各立  
合同以為證據為再罷工即拿獲治罪石匠亦有  
認可之意此係目下之情形也補到後印與小彭  
商議照此辦法係一勞永逸之計即廠商增價  
亦所甘心業與審判歷會商矣但此情形我  
王不必實告廠商但切責廠商令其速為籌  
畫勿蹈誤工之罪惟其到工來商議議定  
仍令審判歷作令便可兩面無傷於工程大有  
裨益

補按意氣二字最是誤事豈精之所監者  
此云之人作者亦此工祇要於工程有益何妨於  
士人言立碑立字據細為研鞠因其勢而導

之一勞永逸惟增價者亦一廠商所樂為者以工  
程外之事請記則真不配矣趙統領不知會監  
督按工頭一面之詞即去拿人是其疎忽要於  
留兵在後單騎去見匠工請首要到營  
商議辦法亦是文明對待目下石匠不敢違言  
者以有陸魁勝之小人無惡不作專心吃工人為事  
工人皆畏之罷工後廠商以此人則系不知議  
何相愛此人屏棄便方定議矣據小彭意之非  
連瓦匠木匠都藉此辦起者却無數煩惱  
不識欲以願否廿日早各小工及春夫全日罷工亦  
以增價為名聚三千餘人在永福寺迤西沿途  
皆是之意以送及寺僧等及小彭亦未



仍令審判廳作合便可兩向無偏於工程大有裨益

補按意氣二字最是誤事。監者之所監者此之工人作者。此工祇要於工程有益何妨於工人言立碑立字據細為研鞠。因其勢而導之一勞永逸。惟地價貴。工價高。所崇為者。以工程外之事。請託則真不配矣。趙統領不知會監督按之頭一面。一詢即去。掌人是其疎忽。要於留兵在後。單騎去見匠工。請首要到堂商議。辦法。此是文明對待。目下石匠不敢虛言者。以有陸魁勝之小人。無惡不作。專心吃工人為事。工人皆畏之。罷工後。廠商約此人。則系不知議何和。要此人。序未便。定議矣。據小彭意。此雖是瓦匠木匠。都藉此辦起者。却多致煩惱。不識然。必欲。百早。多小工及春夫。全與工。以增價者。名。聚三千。好人在。福寺。迤。西。沿途皆是。意。以。送飯時。搶飯。知會。彭。尚未到。知會。丁。張。二。管帶。派兵。數十人。彈壓。護送。幸保無事。完。工人可惡。亦可憐。彼廠商者。非。罷工。不。給錢。彼。此。得。不。致。充。即。倡。於。作。工。時。酌量。以。漲錢。不可。即。預。為。計。也。可。省。錢。也。可。得。人心。廠商。各。財。克。己。亦。真。可。惡。凡。說。賑。東。供。是。一。片。謊。言。之。頭。段。之。價。已。甚。六。成。中。未。以。一。半。試。問。其。能。何。用。項。關。三。合。分。權。欲。出。款。項。以。收。帳。生。息。而。工人。應。得。之。錢。便。新。不。可。實。屬。可。惡。補。俟。後。來。為。



何情形再行奉

閱

再小彭自接

實示以來日夜愁思籌措為此辦法但  
延監督在工不便通信適李五甫赴京  
以便將辦理情形詳告之以便轉  
達又以此天晚不克晤

面異日即返工現已籌畫畫在此專函奉  
閱順敬

崇安北祐密呈

廿二日



恭呈

王

爺

爵

啟

工字等捌百肆

陸工類



王爺爵前敬稟者各殺少工於昨日午後  
八點鐘放砲為號嘯聚千餘人一擁向  
廣靈銷伙要飯無理取鬧大衆商議  
若不給飯伊等蠢愚無知搶街上小  
本生意及住戶惹禍更甚後患不  
堪設想一面令廣靈即為備飯一面  
有丁管帶彈壓并極力開導承  
許昨早各殺向各鍋伙吃飯如稍  
幸夜間無事今日黎明即放砲為  
號聚人甚眾遇有送飯大家搶食  
真是不成事体刻工次絕糧木瓦  
各作金俸俱罷此等頑民不施以威  
見毅軍所帶鎗刺皆疑為虛文  
酌後事無不棘手



先帝梓官左右若今此輩橫行真令人方為不平現趙統領自通州歸來已多派隊伍四面彈壓恐滋生事端祈

王爺切責廠商令其於各工作一律漲價速為挽回以補救工程若價已漲是再生事滋擾藉罷工為要挾非

具奏請

旨斬殺凡工程斷無起色蓋此等頑民藉增價為名價漲急必不能滿意必另設法斯時殺之為有名而受刑者尚心不愧不識

憲意以為各何特專差致達即啟  
福安 趙勳 謹呈



恭呈

王

爺

爵

啟

王爺第捌百伍

號

一

工類



敬稟者全體罷工聚眾要挾非飭廠商  
增價永無開工之日且工人藐視功令已達  
極點若不嚴定章程政令煌煌奏章臨  
時誤限若將誰屬於整制工匠共專責  
廠商均非持平之論再四思維惟為兩面  
設法并於工程有裨益者謹擬章程三  
條恭呈

鈞鑒

一宜嚴加懲創也大小工程<sup>作</sup>疲頑已極告示張  
貼伊等視為具文派兵彈壓伊等視同  
虛設聲言搶飯屠豕做出實事一似承  
修大臣均無加彼何者計惟有具奏請

旨之一法人皆畏死增價後必各工工即將  
旨意宣布或實貼街衢俾眾周知則不怒  
民畏或可從此馴順即偶遇兇暴亦有一定  
辦法而無所棘手矣

一宜嚴定規則也去年石匠已漲到銅元七十七  
枚今年只出五十九枚迭次罷工無非爭其舊  
價宜督催廣壘各家認出去年工價令石  
匠立字為據令廠商將石作工程派定期限  
則功成必速而瓦木各作亦可仿照辦理并於字  
據上註明嗣後各匠再有罷工即嚴辦首要  
廠商若不照給亦重懲不貸庶工程無耽延  
之弊也

一宜體恤商家也小工名列外簿者飭令商人管



貼伊等視為具文派兵彈壓伊等視同  
虛設聲言搶飯店於做出實事一似承  
修大臣均無加彼何者計惟有具奏請  
旨之一法人皆畏死增價後必各工工即將  
旨意宣布或實貼街衢俾眾周知則不怒  
民畏或可從此馴順即偶遇兇暴亦有一定  
辦法而無所棘手矣

一宜釐定規則也去年石匠已漲到銅元七十七  
枚今年只出五十九枚迭次罷工無非爭其舊  
價宜督催廣慶各家認出去年工價令石  
匠立字為據令廠商將石作工程派定期限  
則功成必速而瓦木各作亦可仿照辦理并於字  
據上註明嗣後各匠再有罷工即嚴辦首要  
廠商若不照給亦重懲不貸庶工程無耽延  
之弊也

一宜體恤商家也小工名列外簿者飭令商人管  
飯不過恐其惹事為一時權宜之計若久無辦  
法商人其何以堪且不列名者當有一年餘人終日  
向廠商游閑亦恐生事况小工亦作略增銅元二三枚  
便可上工而廠商亦省無數騷擾正所以示體恤也  
以上三條係為工商兩面着想不為是則遷就無可遷就  
仍舊敷衍決無開工之望必至逾限不能歲事惟我

王峯核施行 遊齡兆麟 謹呈



再稟者加片請

旨須跟此次月摺具奏不致滋

監國疑慮工次亦可早得辦法有所遵循但加片  
措詞務請嚴厲方覺妥當乞我

王斟酌之

廿三日分夫共口角羣毆分頭受傷甚重經

趙統領拿獲二名送交審判廳辦理

廿四日有不列外簿之小工數十人因停工無着為  
飢所迫適值西天和送飯羣起搶食經趙統  
領極力解散

廿五日有不列外簿之小工二百餘人在

行宮橋南將藝和土作支錢簽牌搶去若干根赴  
該廠取錢經趙統領帶隊極力彈壓該廠  
亦以此輩為飢餓所迫現已從權了結蓋此  
等搶奪共飢民無異倡能早日開工便可無  
事謹將近日情形臚列附

聞

王爺爵啓刻下工次頭緒紛繁  
小彭一味挽留不讓下班為此  
不敢自專請  
密示以定行止順候

崇安麟謹呈

二十五日







恭呈  
繖子胡同

王

爺

鈞

啟



王爺鈞鑒續喜子等後該廠商不辭  
而去祇賸工頭唯乞諾乞辦理甚形棘  
手懇

嚴諭廣豐興隆於明日即速到工以  
便就近商確萬不可緩蓋此事乃  
廠商內事商妥趕快上工即便了  
結各石匠因切實拏辦心膽皆虔

趁此辦去最易順手機會萬不可  
失也續喜子押解易州該州請留  
兵百名至二十餘家派兵六百多名保其備伏廠商及石匠徒  
弟工工各段亦賴保護兵力單弱恐  
生事端請電致直提將趙個坐營  
添派到工以資熟手天降大雨恐  
電綫不通電已發又專函奉

聞順候  
福安

張光齡  
李兆麟

謹呈

初八日





恭呈綴子胡同

王

爺

鈞

啓

王爺爺  
捌百叁拾柒



王爺鈞鑒今日石匠徒弟業上工數十  
名此不過小試其端亦先去以為民望之  
意清晨土工聚數百會議而不敢明目  
張膽抗抵亦由兵力有以畏其心也看  
此情形大約十日內外約可辦理齊楚  
但停工日久頭緒紛繁無可着手此  
事辦去或慮張聲勢或慮與委蛇

或用強硬手段局中自有道理如有傳  
聞恐至失實我

王不必疑慮內中情形外人不得而知  
決不至有過當之虞而夙夜焦思亦竭  
情盡慎不留餘地矣趙統領個與此  
事早出夜歸無一刻之暇其彈胫布  
置梭巡無懈可擊雖士卒用命亦

調度有方各廠商呈稟懇留其兵力  
令人悅服亦可想見趙統領血性過人  
義氣素著如有鎮缺相當者出可令  
代補以酬其勞妙在趙不到任無論  
補某缺彼決不前任并不侵他人地  
地步願我

王酌之

北麟

謹呈

初九日
