

# 第十二冊頭身一次報告

工字第陸百柒拾貳號

代監督 馮恕 遜齡 監修 朱開第 牟其汶 廷順 辦事官 榮源 李廷瑞 等謹將

方城月臺踏蹂等處墻底劃分三段築打灰土做法尺丈分晰開後

計開

四月二十三日

方城大墻頭段由北起進深四丈三尺面濶八丈六尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步虛高七寸五分折方丈三十六丈九尺八寸

二十四日

方城大墻頭段灰土進頭二三七券二十六墻築打旱虛每券二十四下夜間落水足透

二十五日

方城大墻頭段灰土進小券八墻加倍充剝行碼一次第二段面濶八丈六尺進深四丈三尺潑水一次潑白灰漿一次上灰土一步

書名 諸陵工程報告不分卷 清鈔本  
卷 冊十二  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 貴重-71  
編號 BX9000600

[彩色首頁1](#)  
[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: BX9000600](#)  
[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-71](#)  
[漢籍善本全文影像資料庫文本諸陵工程報告不分卷 清鈔本](#)  
版權所有: 東京大學 東洋文化研究所  
[使用上的注意事項](#)

卷  
號

第 冊  
東方文化學院東京研究所  
No. 4881

廠商應辦各件 共五十三號



別 置  
甲 71



應添桌橙等件清單

呈

工字第壹百零叁號

謹將

崇陵頭段工次修建坐落房內外檐裝修及床張桌  
凳鋪墊等項分晰開後

計開

坐落房二座每座三間內二次間安技摘窓二  
槽隨玻璃窓紗屈明間安夾門窓門頭窓風  
門全分內檐木板隔斷一槽几腿罩一槽順山木  
床一鋪後檐木床一鋪各隨掛面炕沿上鋪炕  
毡一層隨藍洋布炕單一分藍裕裊坐禪二

分靠枕二分

六仙桌二張

炕桌二張

椅子二張 代墊

杌凳八個 代套

茶几二張

錫茶壺一把

磁茶壺一把

銅茶盤二個

磁蓋碗二個

錫茶盤二個

磁茶盅十六個 紅圈龍花

錫茶托八個

水火壺一把

小水缸一口



閱表着於粗用木器外酌添  
洋式矮牀桌椅數件不  
得奢華合用而已決批繳

三月初三日

廣豐木廠具



稟呈<sup>據</sup>商添購鋪墊銀數清單稟

丁字第一零肆號

崇陵工程處謹

稟所有興隆等廠擬請

行宮外東西公所添買鋪墊銀兩數目清單封送呈

閱為此謹

稟

二十七日





添購鋪墊毯帘等物價銀數目清單

呈

謹將

行宮外

東西公所添買鋪墊毡帘玻璃攬各項物件覈實銀兩數目  
表列於左

計開

元青德國緞相邊藍花德國緞心簾架帘十五箇 每箇材料十二兩 核銀壹百八十四兩

又工價 每箇八錢 核銀十貳兩

元青德國緞坐褥靠枕四十六分 每分材料九兩六錢 核銀四百四十一兩六錢

又工價 每分七錢 核銀三十貳兩貳錢

元青德國緞二人橙套三箇 每箇材料貳兩三錢 核銀七十八兩貳錢

又工價 每箇三錢 核銀十兩貳錢

元青德國緞杌橙套壹百七十二箇 每箇材料壹兩六錢 核銀貳百七十五兩貳錢

又工價 每箇貳錢五分 核銀四十三兩

元青德國緞椅墊四十二箇 每箇材料九錢 核銀三十七兩八錢

又工價 每箇壹錢五分 核銀六兩三錢

藍裕裱坐褥靠枕四十分 每分材料四兩九錢 核銀壹百九十六兩

又每分工價七錢 核銀貳拾八兩

青布布廂邊藍裕裱心簾架帘二十五箇 每箇材料五兩七錢 核銀百零二兩五錢

又工價 每箇八錢 核銀貳十兩

藍裕裱二人橙套三十六箇 每箇材料壹兩貳錢 核銀四十三兩貳錢

又工價 每箇三錢 核銀十兩八錢

藍裕裱杌橙套一百三十箇 每箇材料八錢 核銀壹百四兩

又工價 每箇貳錢五分 核銀三十貳兩五錢

藍裕裱椅墊十四箇 每箇材料五錢 核銀七兩



藍裕德椅墊十四箇 每箇材料五錢 核銀七兩

又工價每箇壹錢五分 核銀貳兩壹錢

青市布廂邊藍市布心八仙桌套四十五箇 每箇材料壹兩貳錢 核銀五十四兩

又工價每箇六錢五分 核銀貳十九兩貳錢五分

青市布廂邊藍市布心天平桌套五十二箇 每箇材料六錢 核銀三十壹兩貳錢

又工價每箇三錢五分 核銀十八兩貳錢

青市布廂邊藍市布心炕桌套四十二箇 每箇材料五錢五分 核銀二十三兩壹錢

又工價每箇三錢五分 核銀十四兩七錢

青市布廂邊藍市布心茶几套五十箇 每箇材料三錢 核銀十五兩

又工價每箇貳錢五分 核銀十貳兩五錢

白洋羅玻璃攪二百五十分 每分材料三錢五分 核銀八十七兩五錢

又銅活 每分壹錢五分 核銀三十七兩五錢

藍市布八仙桌套二十九箇 每箇六錢五分 核銀十八兩八錢五分

又工價每箇壹錢五分 核銀四兩三錢五分

藍市布天平桌套四十六箇 每箇材料三錢五分 核銀十六兩壹錢

又工價每箇壹錢五分 核銀六兩九錢

藍市布炕桌套四十分 每分材料三錢 核銀十貳兩

又工價每分壹錢五分 核銀六兩

藍市布茶几套三十八箇 每箇貳錢 核銀七兩六錢

又工價每箇壹錢 核銀三兩八錢

青市布走水香色市布帘五十箇 每箇材料壹兩五錢 核銀七十五兩

又工價每箇貳錢五分 核銀十貳兩五錢

蒙藍市布炕毯九十四塊 每塊七兩 核銀六百五十八兩

炕毯二十八塊 每塊三兩七錢 核銀壹百三兩六錢

車腳運費銀三十五兩

車脚運為銀三十五兩

以上共核工料併運脚實銀貳千九百八十五兩貳錢五分





稟據商請款單附原呈一紙

崇陵工程處謹

稟現據廠商呈遞請款原呈一件封送呈

閱謹稟

閏二月二十九日





按照市價核減工料銀數單

崇陵工程按照市價樽節核實刪減淨估需工料實銀伍百柒萬伍百玖拾兩貳錢玖分陸釐

又採買杉木錫鉛鐵顏料琉璃共核實銀肆拾肆萬陸千捌百叁拾兩叁錢肆分柒釐

通共核銀伍百伍拾壹萬柒千肆百貳拾兩陸錢肆分叁釐內

頭段分修各工應分領工料銀壹百玖拾捌萬貳百肆拾貳兩伍錢貳分貳釐

又分領採買杉木錫鉛鐵顏料琉璃銀玖萬柒千叁百伍拾伍兩柒錢貳分叁釐

二段分修各工應分領工料銀壹百壹萬貳千捌百陸拾柒兩玖錢陸分伍釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀拾叁萬陸千柒百柒拾柒兩叁錢貳分陸釐

三段分修各工應分領工料銀壹百叁萬玖千柒百拾陸兩伍錢叁分壹釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀拾貳萬柒千肆百捌拾兩捌錢叁分貳釐

四段分修各工應分領工料銀壹百叁萬柒千柒百陸拾叁兩貳錢柒分捌釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀捌萬伍千貳百拾陸兩肆錢陸分陸釐



### 按照市價核減工料銀數單



通共核減工料銀數單

工字第壹百零捌號

崇陵工程通共核減工料銀捌拾貳萬陸千陸百玖拾伍兩捌錢陸分柒釐

頭段分修各工核減工料銀叁拾萬伍千陸百叁拾捌兩伍錢肆分玖釐

二段分修各工核減工料銀拾陸萬柒千玖百拾貳兩伍分柒釐

三段分修各工核減工料銀拾陸萬貳千貳拾叁兩伍分

四段分修各工核減工料銀拾玖萬壹千壹百貳拾貳兩貳錢壹分壹釐



通共核減工料銀數單

工字第壹百零捌號





各屋應用器具數目單

工字箱壹百零玖號

謹將各屋應用器具西式桌椅數目開列清單敬呈

鈞覽

計開

正房三間兩明間一裏間

正明間應用

元桌一張

椅子六把

連二抽屜桌一張

掛燈一件

次明間應用

順山木床一座帶掛面一分

茶几兩個

椅子四把

洋磁水盂兩個

坑几兩張

坑桌一張

裏間應用

連二抽屜桌一張

茶几一個

椅子兩把

桌燈一件

洋磁水盂一個

坑几兩張

坑桌一張



坑桌一張

以上應用桌子十三張椅子十二把水盂三個  
木床一座桌燈掛燈各一件

四處共用桌子五十二張椅子四十八把水盂十二  
個桌燈掛燈八件掛面木床四座各屋原有傢  
具擬先運至監督各屋如不敷用再行添辦現  
買一切傢具俟

工程處修妥後即可運至該處備用





鈔呈廠商來呈擬即批駁稟

工字第壹百壹拾號





需用架木不敷擬請統由廠商辦理稟

敬稟者前因工程需用架木行查民政部據民政部  
咨覆查明所轄木倉木廠兩處實存長短架木六  
千三百餘根萬不敷本工之用聞各省解運亦甚遲  
緩可否統由廠商辦理之處呈請  
酌定





勘較圖式各情單

呈

工字第一壹百貳叁號



謹將勘較圖式各情繕單恭呈

鈞鑒

計開

一正院垂花門內山子石甬路須拆去改修加寬木橋一座石欄杆亦須拆去南北各兩段

一垂花門西邊原有遊廊各六間舊存底座現已拆去圖未注

一正殿須拆去後廊接修後厦三間如修五間恐礙兩邊松樹

一東所前院後連原有穿堂大門圖未注前後連原有淨房各一間圖未注



一東所後院北房東山前檐原有東西卡牆一段

圖未注

一東所後院正房西山原有備用房兩間圖只注一間

一西所中院正房西有卡子牆一段原有西房三間圖未注

一西所前院前進原有淨房一間圖未注後連東山原有卡子牆一段圖未注

一三捲前垂花門兩傍遊廊缺少六間圖未注

一三捲前遊廊共二十六間內六間無存圖未注

此院垂花門坍塌



擬飭廠商造具保結及做法清冊批

擬批

查此案工程錢糧數目本監督前經面奉

堂諭飭令該商核減今據來呈並未遵

諭辦理礙難代為呈遞呈鈔存繳所有做法清冊及

保結仰即迅速造齊呈送毋延此批





郭雲鴻等分受官密地畝數目單

工字第一百叁壹號

郭雲鴻當年有分受官窰地一頃後推與郭洛照名下七十畝上下推契  
上寫五十畝上下餘寫多少在內又推與齊廣泰十八畝又推與王昆十畝俱有  
推契為憑王昆十畝現推與董洛悅名下

郭洛照人有己身分受官窰地一頃

郭銳峯有分受官窰地一頃

郭平之有分受官窰地一頃

以上四頃並道段窰底通共約計五頃有餘

東至窰神廟

西至大道

南至石庄大道溝

北至三郎廟並大道

四至內私種官窰地人姓名



李洛瑞

崔洛德

侯洛貴

王洛頭

一頃有餘

石庄溝北郭洛照地界南有庄頭租地五六十畝



崇呈公所添購木器價銀數目單稟

工字第壹百肆肆號

崇陵工程處謹

稟現據興隆等廠將

行宮外東西公所添買木器等項銀兩開單呈遞前來謹  
將原單封送呈

閱謹稟



閏二月二十六日



興隆廠

傳飭各廠商傳單底

工字第壹百伍肆號



謹將傳單列後

宗陵工程處為傳知事現奉

堂諭

行宮工程著派興隆東昇天利三廠公同敬謹承修

宗陵工程後段內之琉璃花門石臺五供以及羅圈牆馬槽溝等工著派興

隆東昇天利公同敬謹承修

宗陵工程後段內之

甯城上下各要工著派廣豐木廠敬謹承修務期一律堅實其各凜慎此諭

廣豐興隆東昇天利等各廠商知悉恪遵辦理相應傳知可也須至

傳者



右傳興隆木廠准此

宣統元年正月十四日傳

宗陵工程處為傳知事今奉

堂諭傳興隆木廠帶樣式房於十八日早九點鐘到工程處勿誤為要合亟

傳知該廠遵切切此傳

正月十七日

辦事官李

正月二十三日

宗陵工程處為傳知事前傳各廠分修後段各工內查出琉璃花門石臺五

供係應歸二段亟宜更正所有馬槽溝仍派興隆廠修理將來

妃園寢後段工程著派興隆東昇天利三廠各按二成工程修理天順天

和永聚興共按四成修理此諭該廠商等一律凜遵辦理此諭

右傳興隆廠

宗陵工程處為傳知事前傳各廠分修後段各工內查出琉璃花門石臺五

供係應歸二段並宜更正所有馬槽溝仍派興隆廠修理將來

妃園寢後段工程著派興隆東昇天利三廠各按二成工程修理天順天

和永聚興共按四成修理此諭該廠商等一律遵照辦理此諭

右傳興隆廠

崇陵工程處傳知事奉

堂諭

崇陵工程後段內之羅園牆亦著興隆廠修理此諭

二月初日

右傳興隆廠



西陵並查勘禮部大小園工程繪圖

二月初四日傳知廣豐興隆兩廠隨赴

所有禮部營房工程著派廣豐興隆東昇天利四廠共按六成修  
理天順天和聚興永三廠共按四成修理特諭



呈送廠商核減錢糧數目暨橋工情形呈三件

附原呈三件

敬稟者本日據廠商將核減錢糧數目並橋工趕辦不  
及情形具呈兩件分繕四分面請代遞前來理合檢  
出原呈兩件封送

堂閱其附遞詳細做法估冊共四本暫存工程處明早  
進內面呈謹此稟

聞

工程處謹呈 二十九日





廠商懇照原估錢糧數目呈

具呈東昇 王恒起木廠商人元利 金榮山呈為懇陳下情叩懇

恩准事竊前

蒙派

西陵暫安處並新建各公所工程謹將所估錢糧數目呈遞在案奉諭再為核減商人等即應遵

諭核減奈因此項趕修活計實與尋常工程不同所用物料

在本地無處採買均係由京購辦轉運到工一切價值運費諸多增漲再者各作匠人皆知三月完工日限緊急深恐伊等居奇抬價商人等再四思維惟有督催匠役晝夜工作額外多加工價方能迅速查此項工程拆修並新建大小房座五百餘間若不設法實難工竣所呈錢糧數目確係核實估算猶恐及時有虧無餘惟有叩懇

監督大人台前轉呈

公諭 諭前 格外格外恩施按原估錢糧數目

恩准商人等極力設法按照期限即行竣工則商人等托庇

鴻慈無極矣為此謹呈



木廠請備澄漿磚數清單

呈

工字第壹百陸號

謹將恭備

妃園寢應需澄漿磚塊按照所需總數分別年限預備現

擬今年按照六成明年按照四成預備數目分晰列後

計開今年預備六成

頭段共用

澄漿城磚貳萬六千六百六十五箇

二段共用

澄漿城磚貳萬五千五百三十貳箇

三段共用

澄漿城磚四萬三千七百五十貳箇

四段共用

澄漿城磚七千七百四十八箇

以上今年共預備澄漿城磚拾萬三千六百九十七箇

計開明年預備四成



頭段共用

澄漿城磚壹萬七千七百七十六箇

二段共用

澄漿城磚壹萬七千貳百壹箇

三段共用

澄漿城磚貳萬九千壹百六十八箇

四段共用

澄漿城磚五千壹百六十五箇

以上明年共預備澄漿城磚六萬九千壹百三十箇

以上今年通共預備澄漿城磚拾七萬貳千八百貳十七箇



以上今年通共預備澄漿城磚拾七萬貳千八百貳十七箇

興隆  
廣豐  
等十七廠具





估需工料銀兩數目單

工字第壹百陸號

崇陵工程共估需工料實銀伍百捌拾玖萬柒千貳百捌拾陸兩壹錢陸分叁釐

又採買杉木錫鉛鐵顏料琉璃共核銀肆拾肆萬陸千捌百叁拾兩叁錢肆分柒釐

通共核銀陸百叁拾肆萬肆千壹百拾陸兩伍錢壹分內

頭段分修各工應分領工料銀貳百貳拾捌萬伍千捌百捌拾壹

兩柒分壹釐

又分領採買杉木錫鉛鐵顏料琉璃銀玖萬柒千叁百伍拾伍兩柒錢

貳分叁釐

貳段分修各工應分領工料銀壹百拾捌萬柒百捌拾兩貳分貳釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀拾叁萬陸千柒百柒拾柒兩叁

錢貳分陸釐

叁段分修各工應分領工料銀壹百貳拾萬壹千柒百叁拾玖兩伍錢捌

分壹釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀拾貳萬柒千肆百捌拾兩捌錢叁分

貳釐

肆段分修各工應分領工料銀壹萬貳拾萬捌千捌百捌拾伍兩肆錢捌分

玖釐

又分領採買杉木鐵料顏料琉璃銀捌萬伍千貳百拾陸兩肆錢陸分陸釐





修改各工單

呈

工字第一壹百陸叁號

謹將現奉

鈞諭着改各工列後

計開

暫安處東西所寬齊頭停牆身灰皮經天寒凍裂

或有酥城遵 諭俟天氣融和迅即敬謹照式修

理堅固於要工無誤

敬廳前及各甬路均着一併妥為另行挑墁修理

週圍大牆裡外皮着將現露接砌加高二尺新舊

兩歧之處全行見新將畫道一律改為抹灰梗成

做

東西新建各公所房間所有山簷牆除現已乾打搗

砌法外有撓灰泥砌各牆拆卸另行打搗乾砌成做

暫安殿錫背所有接口處均釘焊堅固

西所院內原有山石清狗縫道毋庸提漿

各殿座棚批子拉扯釘安堅固塵土去淨以

期堅固而重要工為此謹呈





呈 各廠現做各工情形單

正字第一百陸肆號

謹將恭修

崇陵頭段工程自三月初五日起至初十日現做活

計分晰開列於後

計開

寶城並地宮各券分位現在起創地基

羅券牆分位鏟除草皮起創地基

碼砌線整

成搭圈廠

興隆兩廠公遞



崇陵二段工程現做活計分晰開列於後

計開

現抄平子過中線

起創石渣山壑打山石

碼砌線整

成搭圈廠

藝和 祥和 東昇 興隆 德祥 德利 聚源

木廠公遞

崇陵三段工程現做活計分晰開列於後

計開

鏟除草皮

碼砌線整

崇陵三段工程現做活計分晰開列於後

計開

鏟除草皮

碼砌線整

天和興隆和  
木廠公遞  
賓興天和



崇陵四段工程現做活計分晰開列於後  
計開

神厨庫分位起創地基

現抄平予過中線

碼砌線整

成搭園廠

中義  
萬豐  
東昇  
木廠公遞

三月初十日





呈 各廠現修工程單

工字第壹百陸伍號

謹將恭修

妃園寢工程自三月初五日起至初十日現做活

計分晰開列於後

計開

現抄平子過中線

碼砌線整

成搭圈廠

天和 聚興 東昇 興隆 木廠並各廠公遞

天利 天順

三月初十日





澄漿磚已飭廠商分別預備稟

敬稟者前據廠商等面稟

陵工應用澄漿城磚均須夏季澄泥預為燒製當經飭令廠商  
分別本年明年應行預備若干開單呈  
閱現據開呈清單相應恭呈

堂墜再各段營房及風水圍牆口子門錢糧數目現經算  
房開出合併呈

閱其綠營營房係

鹿堂飭開兩單以便酌辦此稟

工程處謹呈 六月十九日





需用澄漿磚數目清單  
廠商原呈數目價值單  
入乙百六十一號

敬稟者日前奉到

手批當即面詢廠商所開需用澄漿磚數目是  
否核實飭將價目分晰開單並將定銀應先  
支付幾成計日出磚若干均飭詳開呈報茲  
據廠商先將價目單開出理合恭呈

鈞閱為此謹稟

工程處謹稟

六月二十五日





呈送廠商應需稅木清摺暨橋座全圖稟

工字第貳百伍拾號

敬稟者茲據廠商開送

崇陵各段分修各工應需梳木架木數目清單一扣又添修

口子門

御路橋座全圖一件理合封呈

鈞鑒

二十三日







頭段分修各工估需銀兩數目單

崇陵工程頭段分修各工共估需工料實銀貳百柒萬柒千伍百玖

拾捌兩貳錢肆分伍釐內

廣豐廠分領工料銀壹百叁萬玖千伍百貳拾肆兩捌錢

興隆廠分領工料銀玖拾肆萬玖千壹百叁拾兩捌錢捌分伍釐砂土料銀兩在內

東昇廠分領砂山工料銀肆萬肆千肆百柒拾壹兩貳錢捌分

天利廠分領砂山工料銀肆萬肆千肆百柒拾壹兩貳錢捌分





呈閱各塘石料用項單暨各石塘地勢圖件稟

敬稟者前奉

鈞諭飭赴大石窩帶查勘石料當於七月二十六日馳赴石窩村借寓顯聖寺

內隨即帶同廠商勘得白石青白石石塘共十六處除飭廠商另備

石樣恭呈

查驗外謹先將勘過各處分開應用細單並按照路程繪圖貼說恭呈

鈞閱其周店山口兩處豆渣石石塘因路程寫遠未能同時查勘據廠

商云該兩處石性無甚區別理合附

聞為此謹稟

計圖一紙單一併



李煜瀛  
蔣式理  
陳宗為  
誠璋  
謹稟



開採各塘青白石料分別用項清單

呈

謹將

崇陵萬年吉地開採各塘青白石料分別用項敬繕

清單恭呈

鈞鑒

計開

雙順塘口石料係

地宮內土襯海墁等項應用

毛絲塘口石料係

平水牆石券券臉角柱等項應用

永順  
石亭 塘口兩處石料係

脫落欂中欂門框石門過梁拉檣瓦片馬蹄

柱子等項應用

八郎廟  
亭山寺 塘口兩處石料係

寶床冊寶座龍山石自來石等項應用

顯聖寺  
上水塘 塘口兩處石料係

啞叭院垂手踏蹠級石垂代如意板子七星溝漏子

等項應用

亭山寺塘口石料係

寶成普卜白岸角柱等項應用

顯聖寺備用塘口兩處石料係  
上水塘

啞叭院垂手踏躑級石垂代如意板子七星溝漏子  
等項應用

亭山寺塘口石料係

寶城牆外泊岸角柱壓面土襯等項應用

石亭塘口石料係

寶城上堞口下壓面挑頭溝嘴荷葉溝等項應用

鎮江營塘口石料係

明樓方城須彌座各土襯階條石過梁石券石門硃  
砂碑溝嘴象眼壓面級石垂代等項應用



棗林塘口石料係

石平橋各攔板地伏橋面金剛牆缸座等項應用

永順塘口兩處石料係  
棗林

石臺五供座五供水溝門溝漏等項應用

亭山寺  
峪二溝塘口兩處石料係

琉璃花門須彌座疊落大料下肩玉帶河壓面

花門角柱級石垂代等項應用

石亭  
鎮江營塘口兩處石料係

隆恩殿土襯須彌座柱頂級石垂代出角獸壓面龍

鳳牙石等項應用

琉璃花門須彌座疊落大料下肩玉帶河壓面

花門角柱級石垂代等項應用

石亭 鎮江營 塘口兩處石料係

隆恩殿土襯須彌座柱頂級石垂代出角獸壓面龍

鳳牙石等項應用

八郎廟 棗林 塘口兩處石料係

攔板柱子抱鼓地伏等項應用

鎮江營 毛絲 塘口兩處石料係

寶龍缸座及滴水板底墊中心石等項應用

青山前懷 旗杆山 塘口兩處石料係

三孔券橋攔板地伏橋面券石金剛牆等項應用



鎮江營 棗林 塘口兩處石料係

宮門配殿朝房焚帛爐紅牆月臺須彌座土襯

階條雲路面枋過門石等項應用

旗杆山下塘口石料係

碑亭須彌座角柱券石踏蹠及

碑身碑蝠水盤等項應用

六塘塘口石料係

牌樓門石柱予抱鼓埋頭土襯角柱壓面石枋禽

口石海漫馬尾蹠蹠及



碑亭須彌座角柱券石踏蹠及

碑身碑蝠水盤等項應用

六塘塘口石料係

牌樓門石柱予抱鼓埋頭土襯角柱壓面石款禽  
口石海墁馬尾蹠蹠及

望柱地伏攔板柱子壓面埋頭土襯東西下馬

牌等項應用

棗林塘口石料係

省牲亭神厨神庫井亭各埋頭土襯角柱壓面  
階條踏蹠水池井攔井衣板等項應用



旗杆山前懷  
塘口兩處石料係  
峪二溝

五孔券橋及五孔平便橋橋面地伏攔板柱子如

意石海墁泊岸壓面角柱神路中心石牙石等

項應用

所有開採豆渣石料塘口分別用項

計開

馬槽溝龍鬚溝水溝溝底溝幫石券背底背後  
等項

隆恩殿

所有開採豆渣石料塘口分別用項

計開

馬槽溝龍鬚溝水溝溝底溝幫石券背底背後等項

隆恩殿

配殿宮門

重檐碑亭牌樓門下馬牌望柱等各底墊礫墩

背底背後等項

省牲亭神厨神庫井亭各礫墩及各

橋座金剛牆雁翅裝板河桶泊岸各等項

以上均用山口店等處豆渣石料



所有

妃園寢應用青白豆渣石料均恭照

崇陵所用各塘口石料開採運使



呈閱廠商呈遞分期請款墮應修各工節畧稟

謹將廠商呈遞分期請款暨應修各工  
畧節共三件送呈

鈞閱

工程處謹呈 八月十六日





頭段分期應修各工節畧

上海圖書館藏書

略節

謹將頭段應修興隆廠分修

宗陵方城明樓玉帶河石平橋海墁樹池缸座羅圈牆馬槽

溝西北來水河以及

妃園寢頭段並禮部營房風水圍牆各等工程按年分做

活計限期並先行購辦各項材料次第分辦情形分

晰列後

計開

宣統元年為第一年閏二月十七日春季開工修造各工

碼砌線墩過中線鏟除草皮平墊地基成搭圈廠開

挖引河

秋季七月十六日開工修造各工

地基分位到槽拉運客土遺槽成搭浮橋碼砌四角線

墩購辦柏木打樁白石灰澄漿各甌塊冬日運至工次並

成搭大罩棚各工

豆渣石料開山冬日及明春次第運至工次

青白石大件至明年冬季運至工次

購備大件木料約至第二年冬季明年春季運到趕即

成做

琉璃各件批定限於第三年春季運至工次

所有釘鐵顏料各項隨時運至工次

第二年春夏季修造各工

各槽內分位築打打樁灰土碼砌磔墩摺砌埋深攔土隨

時墁墊築打觀平土至地平墁打石料砍做礮細澄漿

城甌

城甃

秋冬季修造各工

成做地盤埋深露明安砌石料乾擺細城甃隨砌背後甃至地平

月台橋座馬槽溝築打打樁灰土隨安裝板及豆渣石料成砌羅圈牆下肩各工

鑿打石料砍細澄漿各甃大件木料冬季明春到工趕即成做

第三年春夏季修造各工

由地平成砌城牆上身並發券安砌石料乾擺澄漿城甃背後甃至上頂並成做大木裝修

月台橋座馬槽溝接安豆渣石料成砌羅圈牆身上頂瓦琉璃並鑿打碑座及琉璃運到工次

秋冬季修造各工



方城上碼砌明樓地盤豎立木架擺安斗科簽錠椽望苦背並搭天橋由地車運碑座安置隨砌山簷牆發券各工

第四年春夏季修造各工

明樓調脊瓦琉璃料件乾擺垛口宇牆

墁月台海墁各地面砌留樹池安石橋欄板以及馬槽溝築打頂面灰土

秋冬季修造各工

明樓油飾彩畫糊飾擺安院前缸座以及扁光石料見細各項零星工程修理一律告成

後寶山左右砂山隨時成做俾早完竣

此工係興隆東昇天利分修

見經各項零星工程修理一律告成

後窰山左右砂山隨時成做俾早完竣

此工係興隆  
東昇天利分修

所有

妃園寢並營房風水圍牆各照大工次第儘前成做一律

告成



宣統元年七月

日

興隆廠謹具





分期請領工料銀兩數目彙

呈

謹將

崇陵並

妃園寢營房風水圍牆全工錢糧按照歷屆工作  
 豫算應用工料銀數分期請領俾固要工歷屆  
 領款均係待用必不可少之數放款充裕得以及早  
 定購大件木料開採大件石料並備辦澄漿等磚  
 琉璃料件及灰筋雜料商等責無旁貸既材料  
 應手趕緊工作自不致有誤期限若放款不足  
 材料不能預備因而誤工待料致有遲延商等  
 亦無可如何理合據實稟明伏乞



鈞鑒

謹將分期請領銀數列後

計開

宣統元年

第一期請領修工備料銀壹百貳拾萬兩

第二期請領修工備料銀壹百貳拾萬兩

宣統二年

第一期請領修工備料銀陸拾萬兩

第二期請領修工備料銀陸拾萬兩

宣統元年

第一期請領修工備料銀壹百貳拾萬兩

第二期請領修工備料銀壹百貳拾萬兩

宣統二年

第一期請領修工備料銀陸拾萬兩

第二期請領修工備料銀陸拾萬兩

第三期請領修工備料銀陸拾萬兩

第四期請領修工備料銀陸拾萬兩

宣統三年

第一期請領修工備料銀叁拾萬兩

第二期請領修工備料銀叁拾萬兩

第三期請領修工備料銀叁拾萬兩

第四期請領修工備料銀叁拾萬兩

宣統四年


第一期請領工料銀叁拾萬兩

第二期請領工料銀叁拾萬兩

第三期請領工料銀叁拾萬兩

第四期請領工料銀叁拾貳萬四千八百四拾貳兩

叁錢肆分貳釐

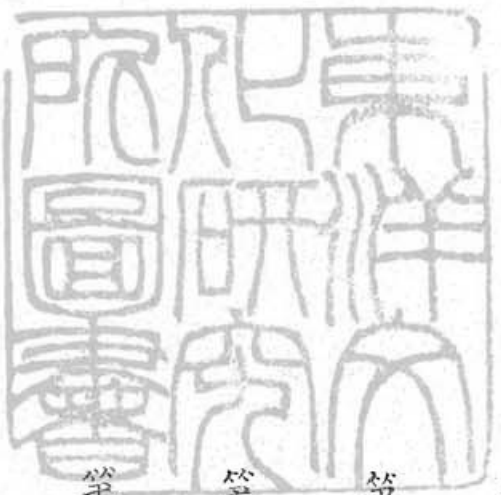

第三期請領工料銀叁拾萬兩

第四期請領工料銀叁拾貳萬四千八百四拾貳兩

叁錢肆分貳釐



萬	天	興	廣	東	天
豐	和	隆	豐	昇	利
天	藝	祥	中	德	聚
和	和	和	義	祥	源
聚	興	德	賓	天	天
永		利	興	順	泉

木廠謹具

七月 日



頭段分修各工節畧

丁巳年冬百

謹將廣豐廠分修

崇陵頭段工程

寶城地宮上下各要工月牙城啞叭院龍鬚溝等  
工程按本年開工限四年告竣敬遵分年按季應  
修工程分晰列後

計開

宣統元年開工伊始應修

地宮及各券分位剷挖大槽以及成搭大罩棚木  
骨均約是年十二月內報齊

宣統二年開工應修



大罩棚苫席大槽並各券分位清理渣土墻砌  
磚墻幫碼下栢木樁打築打灰土

地宮龍鬚溝二道

約于是年六月內報齊

二年七月起至十二月應修

地宮各券裝板石土襯背底背後金券海墁脫落  
杓中杓門框等石安平水石五層隨安背後豆渣  
石隨砌背後磚築打背後灰土安置寶床

宣統三年開工至六月應修

二年七月起至十二月應修

地宮各券裝板石土襯背底背後金券海墁脫落  
欵中欵門框等石安平水石五層隨安背後豆渣  
石隨砌背後磚築打背後灰土安置寶床

宣統三年開工至六月應修

地宮各券平水石成安四層隨安背後豆渣石料隨  
砌背後磚築打背後灰土

三年七月起至十二月應修

石門銅管扇拉扯過樑瓦片平水等石隨接發  
石券及隧道券閃當券發五伏五券磚券

宣統四年開工至六月應修



各券接發石券隨背後磚券發五伏五券

寶城月牙城泊岸埋頭安豆渣石料隨築打背後  
灰土泊岸上皮押面土襯啞叭院七星溝漏出水溝  
二道隧道象眼牆等石磚券上廡殿簔衣磚頂  
四年七月起至十二月應修

寶城月牙城城身乾擺細磚隨砌背後隨式磚築  
打背後灰土

啞叭院內轉向踏蹂

城上安週圍壓面挑頭溝嘴荷葉溝柵欄角柱等

四年七月起至十二月應修

寶城月牙城城身乾擺細磚隨砌背後隨式磚築

打背後灰土

啞叭院內轉向踏蹠

城上安週圍壓面挑頭溝嘴荷葉溝柵欄角柱等

石並乾擺塚口字牆海墁築打灰土寶頂上頂

抹飾

寶城泊岸散水啞叭院海墁等磚中心石隧道馬尾

蹠蹠

禮部營房風水圍牆各工隨時修理

以上各工所有未詳工程按照估冊隨時一律興修至于



所具分期按季交收做法於各項物料尚可應手備

辦預期到工自能按期不誤惟石料為極大沉重

一有錢糧遲滯或有道路非特則工人無錢難集

練車碍滯轉運不免稍遲于分期之後若錢糧

寬裕橋路暢通開採自是得力石料自必有餘大

小料件自可如期到工抑或趕辦按季之前不待

催促商人尤為喫緊所有開採石件較諸物料棘

手情形理合預先聲明謹

呈



為石車道之免租于分期之後若錢糧

寬裕橋路暢通開採自是得力石料自必有餘大

小料件自可如期到工抑或趕辦按季之前不待

催促商人尤為喫緊所有開採石件較諸物料棘

手情形理合預先聲明謹

呈

宣統元年七月二十三日





呈閱各廠請設小鐵道各呈稟

謹將廣豐等十六廠及興隆廠稟請自設小鐵道並懇  
咨地方官出示曉諭呈各一件恭呈

鈞閱

工程處謹稟 八月二十六日





予六做請設利便鐵道呈

呈

謹

稟為安設利便小鐵道專用人力推轉以次運取而濟工  
作事竊<sup>商</sup>等蒙

派恭修

宗陵工程惟地勢低窪應行墾墾用上甚鉅且係開工以前必須  
 首務更加甄瓦灰石等料雖有火車可運距工次尚隔數  
 里其一切短運閉繫重要查易州地狹民疲所養牲畜  
 尚不自足耕種之力若僱用數百車輛實屬不易有  
 誤工作<sup>商</sup>等商酌自行租賃輕便小鐵道用人力推車  
 轉運灰土各料比較牲畜火車雖價無減省而運料甚  
 便若用火車頭核於園廠物料殊多未便是以專用  
 人力推送以昭慎重似此請辦使全工通用皆可得其  
 利便且旁道擺放亦不得車馬行走詳勘由該土塘  
 設道經由處所均係官地並不佔用民地嗣後若改挪  
 土塘倘佔民地由<sup>商</sup>等查勘明白公擬每畝每年議給  
 租銀兩對待必照和平辦理萬不敢起生事端但附近  
 居戶良莠不一為此叩求  
 恩准咨行地方衙門並請出  
 示曉諭近居旗民人等毋許攔阻擾害等情<sup>商</sup>等實  
 為轉運材料利便起見為此叩求



為轉運材料利便起見為此叩求

大人轉呈

公 爺

貝勒爺

貝子爺

中 堂

爵前恩准施行謹

稟



宣統元年八月

日具稟

德天祥聚省天藝萬廣天東中天聚德天  
祥利和興順和豐豐和昇義泉源利和



興隆廠請設利便鐵道呈

呈

具呈興隆木廠商人馬文斌稟為安設利便小鐵道以人力推轉俾資運取而濟要工事竊商蒙派恭修

崇陵工程惟須敬謹籌劃庶資興修嗣因詳查運土運料係首先要件惟用小鐵道尚屬輕便查舊式不用火車頭更屬慎重因廠物料用人力推轉猶覺利便俾免僱拉運大車較多殊屬匪易而且所需材料甲於各廠是以自行預備小鐵道於運料之際免與各廠爭先恐後可期轉運隨時能濟要工無誤所有安置道路與各廠互相和衷共濟以便工作惟查由土塘轉運及材料一切經過地方均屬官地並不佔用民田嗣後若改挪土塘道經佔用民地由商查勘明白按每年發給地租以和平辦理萬不敢稍生事端但附近居民行人良莠不齊惟有叩懇恩准咨行該管地方出示曉諭附近旗民人等勿許擾害等情商誠為轉運材料利便俾資要工起見為此叩求

監督大人轉呈

公 爺  
貝勒 爺 爵  
貝子 爺  
中 堂 閣  
前俯念工程重要俾資興修所請叩祈

恩准施行謹

呈

宣統元年 八月二十三日具呈興隆木廠商人馬文斌





崇陵頭段工程做裝訂八冊呈閱稟

敬稟者現將

崇陵工程頭段做法用蠟板印出裝成八冊恭呈

存覽

工程處 八月二十四日





開採各塘青白石分別用項清單

與二百八十五號同

謹將

崇陵萬年吉地開採各塘青白石料分別用項敬繕清單

恭呈

鈞鑒

計開

雙順塘口石料係

地宮內土襯海墁等項應用

毛絲塘口石料係

平水牆石券券臉角柱等項應用

永順塘口兩處石料係



脫落檻中檻門框石門過梁拉扯瓦片馬蹄柱子等

項應用

八郎廟塘口兩處石料係

寶床冊寶座龍山石自來石等項應用

上水塘塘口兩處石料係  
顯聖寺備用

啞叭院垂手踏蹂級石垂帶如意板子七星溝漏子

等項應用

亭山寺塘口石料係

寶城牆外泊岸角柱壓面土襯等項應用

上水塘  
顯聖寺  
塘口兩處石料係  
備用

啞叭院垂手踏蹂級石垂帶如意板子七星溝漏子  
等項應用

亭山寺塘口石料係

寶城牆外泊岸角柱壓面土襯等項應用

石亭塘口石料係

寶城上垛口下壓面挑頭溝嘴荷葉溝等項應用

鎮江營塘口石料係



明樓方城須彌座各土襯階條石過梁石券石門硃砂  
碑溝嘴象眼壓面級石垂帶等項應用  
棗林塘口石料係

石平橋各欄板地伏橋面金剛牆缸座等項應用

永順  
棗林塘口兩處石料係

石臺五供座五供水溝門溝漏等項應用

亭山寺  
峪二溝塘口兩處石料係

琉璃花門須彌座疊落大料下肩玉帶河壓面花門

角柱級石垂帶等項應用

石亭  
鎮江營塘口兩處石料係

隆恩殿土襯須彌座柱頂級石垂帶出角獸壓面龍鳳

牙石等項應用

琉璃花門須彌座疊落大料下肩玉帶河壓面花門

角柱級石垂帶等項應用

石亭  
鎮江營塘口兩處石料係

隆恩殿土襯須彌座柱頂級石垂帶出角獸壓面龍鳳

牙石等項應用

八郎廟  
棗林塘口兩處石料係

欄板柱子抱鼓地伏等項應用

鎮江營  
毛絲塘口兩處石料係

寶龕缸座及滴水板底墊中心石等項應用

青山前懷  
旗杆山塘口兩處石料係



三孔券橋欄板地伏橋面券石金剛牆等項應用

鎮江營  
棗林塘口兩處石料係

宮門配殿朝房焚帛爐紅牆月臺須彌座土襯階條

雲路面枋過門石等項應用

旗杆山下塘口石料係

碑亭須彌座角柱券石踏蹠及

碑身碑蝠水盤等項應用

六塘塘口石料係

牌樓門石柱抱鼓埋頭土襯角柱壓面石檻禽口

石海漫馬尾蹠蹠及

碑亭須彌座角柱券石踏蹠及

碑身碑蝠水盤等項應用

六塘塘口石料係

牌樓門石柱子抱鼓埋頭土襯角柱壓面石檻禽口  
石海墁馬尾蹠蹠及

望柱地伏欄板柱子壓面埋頭土襯東西下馬牌等

項應用

棗林塘口石料係

省牲亭神厨庫井亭各埋頭土襯角柱壓面階條蹠  
蹠水池井欄井衣板等項應用



旗杆山前懷  
峪二溝塘口兩處石料係

五孔券橋及五孔平便橋橋面地伏欄板柱子如意

石海墁泊岸壓面角柱神路中心石牙石等項

應用

所有開採豆渣石料塘口分別用項

計開

馬槽溝龍鬚溝水溝溝底溝幫石券背底背後等項

隆恩殿

配殿宮門

所有開採豆渣石料塘口分別用項

計開

馮槽溝龍鬚溝水溝溝底溝幫石券背底背後等項

隆恩殿

配殿宮門

重檐碑亭牌樓門下馮牌望柱等底墊礫墩背底

背後等項

省牲亭神厨庫井亭各礫墩及各

橋座金剛牆雁翅裝板河桶泊岸各等項

以上均用周山口等處豆渣石料



所有

妃園寢應用青白豆渣石料均恭照

崇陵所用各塘口石料開採運使





廣豐廠呈分別採用各塘石料單

呈

謹將

崇陵萬年吉地開採各塘青白石料分別用項敬繕清單

恭呈

鈞鑒

計開

雙順塘口石料係

地宮內土襯海墁等項應用

毛絲塘口石料係

平水牆石券券臉角柱等項應用

永順石亭塘口兩處石料係



脫落檻中檻門框石門過梁拉擔瓦片馬蹄柱子等

項應用

八郎廟亭山寺塘口兩處石料係

寶床冊寶座龍山石自來石等項應用

上水塘顯聖寺塘口兩處石料係  
備用

啞叭院垂手踏路級石垂帶如意板子七星溝漏子

等項應用

亭山寺塘口石料係

寶城牆外泊岸角柱壓面土襯等項應用

上水塘  
顯聖寺塘口兩處石料係  
備用

啞叭院垂手踏路級石垂帶如意板子七星溝漏子

等項應用

亭山寺塘口石料係

寶城牆外泊岸角柱壓面土襯等項應用

石亭塘口石料係

寶城上塍口下壓面挑頭溝嘴荷葉溝等項應用

廣豐木廠謹具





各廠商呈請所需物料擬稍變通購辦稟

呈

東昇 王恒起 萬豐 劉金堂 聚源 劉清山  
 興隆 馬文斌 天順 李萬通 德祥 傅文祥  
 具稟 廣豐木廠商人楊逢春 藝和 木廠商人 薛備 天和 木廠商人 李貴玲  
 天利 金榮山 中義 聚興永 木廠商人 薛備 天和 木廠商人 李貴玲  
 天和 劉鳳玉 寶興 武東度 祥和 馬文連 德利 釋文保

稟為聲明工作所需物料擬請 恩准稍加變通俾得購辦以資工用  
 事竊商等蒙

派恭修

崇陵以及

妃園寢各等工程其所需物料均屬遵照做法估冊逐一購備惟查所

用柏木椿一項考核估冊內每根係長一丈五尺徑七寸商等業已照

原尺寸分赴各處山場地方採辦遍加較閱相符尺寸者甚屬寥寥

寥誠恐臨時不敷所用商等公同商酌惟有儘符尺寸者購辦

使用如若不敷擬請稍從變通酌用長一丈二尺徑大由五寸至六寸者

雖尺寸稍短小然價值相差無幾惟各座地基最關重要此次

所請兼用尺寸較小者必須額外多加用根數方屬堅固總期

以保重為度商等責無旁貸無不盡力萬不敢稍存遷就

有負重恩惟有據情稟請

監督大人轉呈



公 爺  
 貝勒爺 爵  
 貝子爺  
 中 堂 閣  
 前恩鑒鈞裁俞允所請商等恭候遵辦俾資採

購以便辦理則感戴鴻慈於無極矣伏乞

恩准施行謹

稟

東昇 王恒起 萬豐 劉金堂 聚源 劉清山  
 興隆 馬文斌 天順 李萬通 德祥 傅文祥  
 廣豐木廠商人楊逢春 藝和 木廠商人 薛備 天和 木廠商人 李貴玲  
 天利 金榮山 中義 聚興永 木廠商人 薛備 天和 木廠商人 李貴玲  
 天和 劉鳳玉 寶興 武東度 祥和 馬文連 德利 釋文保

天利  
天和

金榮山  
劉鳳玉

中義  
寶興

武東慶  
馬文連  
祥和  
德利

李貴玉  
焦起坪  
韓文佩

宣統元年九月十九日

謹稟



奉祀禮部營房內添改各項估需銀數單



謹將

奉祀禮部營房內添改各項活計估需工料銀兩數目開後

計開

禮部營房大圈內

西面撤去原估營門一座一間

隨撤去原估營門內更房一間影壁一座

隨撤去原估營門分位添修大牆一段長一丈六尺八寸

東北面大牆外原估虎皮石護脚泊岸一道今擬改修豆渣石

泊岸一道折長七十五丈連埋頭高四尺

南面大牆外添挖洩水土河一道長七十五丈均寬一丈二尺均深五尺

小圈營房內

添修食水井一眼等工

以上添改各工共估需工料實銀陸千肆百伍拾壹兩伍錢陸分貳

釐內劃除原估工料銀壹千伍百伍拾玖兩陸錢叁分

淨估需工料實銀肆千捌百玖拾壹兩玖錢叁分貳釐

續估之數相應不  
理可也







呈 廠商與工頭

姓名 住址

工字號 肆百零捌號

謹將遵奉

堂諭派修各廠商人及工頭姓名住址分晰開列於後  
現奉

洵堂派

興隆木廠 住址  
西四牌樓羊市路南

商人馬文藏

霍奎謙

工頭 郭文質



洵堂派

廣豐木廠 住址  
東馬市南路西

商人楊逢春

劉文彬

工頭 趙有純

洵堂派

東昇木廠 住址  
東安門內路南

商人王恒起

李存書

工頭 王汝勤

洵堂派

天利木廠 住址  
鼓樓西大街路南

商人金榮山

賈新春

商人王恒起

李存書

工頭

王汝勤

洵堂派

天利木廠

住址

鼓樓西大街路南

商人金榮山

習新齋

工頭

胡登山

洵堂派

天和木廠

住址

西四牌樓迤南路東

商人劉鳳玉

王德泰

工頭

王德壽



洵堂派

聚興永

住址

交道口東路南

商人薛備

工頭

洵堂派

天順木廠

住址

馬大人胡同

商人李萬通

工頭

倫堂派

興隆木廠

住址

西四牌樓羊市路南

商人馬文臧

霍奎謙

商人李萬通

工頭

倫堂派

興隆木廠 住址  
西四牌樓羊市路南

商人馬文藏

霍奎謙

工頭

郭文質

倫堂派

東昇木廠 住址  
東安門內路南

商人王恒起

工頭王啟祥



倫堂派

聚源木廠 住址  
北鑼鼓巷路東

商人劉清山

工頭李雲龍

倫堂派

德利木廠 住址  
地安門內景山後

商人韓文佩

工頭韓春

倫堂派

藝和木廠 住址  
崇文門內鈞餌胡同

商人劉萬和

商人韓文佩

工頭韓春

倫堂派

藝和木廠 住址 崇文門內鈞餌胡同

商人劉萬和

工頭劉德昌

倫堂派

德祥木廠 住址 虎坊橋東路北

商人傅文祥

工頭



倫堂派

祥和木廠 住址 東四牌樓東大街路南

商人焦起坪

工頭

澤堂派

興隆木廠 住址 西四牌樓羊市路南

商人馬文藏

工頭 霍奎謙 郭文質

澤堂派

天和木廠 住址 地安門外迤東路北

商人張寅彬

商人馬文藏

工頭 霍奎謙  
郭文質

澤堂派

天和木廠 住址 地安門外迤東路北

商人張寅彬

工頭 董思慎  
白永善

澤堂派

賓興木廠 住址 地安門外迤西路北

商人馬文連

工頭 范文誌



鹿堂派

萬豐木廠 住址 鼓樓東路北

商人劉金堂

工頭 李志敏

鹿堂派

中義木廠 住址 燈市口西迤北路東

商人武秉虔

工頭 王文俊

鹿堂派

東昇木廠 住址 地安門內路南

商人王恆起

商人武秉虔

工頭 王文俊

鹿堂派

東昇木廠 住址 東安門內路南

商人 王恆起

工頭 王啟祥





寶城並地宮各券大塘清單

己齊未齊

呈

五字號肆百零玖號



謹將

寶城並地宮各券大槽已齊未齊列後

計開

明堂券往南至方城各槽均已創齊

穿堂券並三層門洞券東西兩頭槽口現起創找平

穴中東面由南起往北至北槽口南北均長六丈均寬

四丈下深均二尺

穴中北面至北槽口南北長四丈八尺寬三丈下深均

四尺六寸

穴中西面至槽口南北均長六丈三尺均寬四丈下深

均五尺

穴中東西面往北甚是潮濕





呈送風水圍牆做法冊二本  
稟冊存閱

正  
冊  
肆  
百  
壹  
拾

敬稟者現將風水圍牆做法冊印齊裝成二本恭呈

鈞閱

工程處謹稟





地宮內需用青白石尺寸單

計開

地宮內青白石

金券面濶三丈八尺七寸進深二丈二尺七寸中高二丈八尺一寸

前石門一層門口濶八尺一寸高八尺七寸五分

第三層門洞券面濶一丈一尺九寸進深九尺三寸中高一丈五尺

前面石門尺寸同前

穿堂券面濶一丈六尺進深一丈五尺九寸中高一丈九尺七寸

第二層門洞券面濶一丈一尺九寸進深九尺三寸中高一丈五尺

前面石門尺寸同前

明堂券面濶二丈四尺五寸進深一丈六尺九寸中高二丈四尺九寸



頭層門洞券面濶一丈一尺九寸進深一丈四尺三寸中高一丈五尺

前面石門尺寸同前

單門券面濶一丈八尺五寸進深九尺中高一丈九尺七寸

閃當磚券面濶二丈一尺五寸進深五尺中高二丈一尺二寸

隧道磚券面濶一丈三尺九寸進深至月牙城外皮三丈五尺五寸

中高一丈三尺四寸

金券內面濶石寶床五張內中一張寬八尺一寸兩邊四張寬

七尺六寸進深一丈二尺俱高一尺三寸

地宮內東西龍須溝二道各長四十六丈八尺



拉運石料沿途道路需工銀兩片底

再大工所需大件石料應用練車拉運行走經由  
易州涑水房山等州縣沿途河道水溝各處亟須  
成搭浮橋及過水涵洞並平高墊低各工查照成  
案飭令該廠商等估計共需工料實銀四萬六千  
零十六兩七錢九分次年經歷夏令雨水遇有損塌  
仍須修補又約估工料實銀一萬六千七百三十三兩  
五錢二分二共實銀六萬二千七百五十九兩零三錢一分  
臣等覆覈所估價值尚無浮冒應責成該廠商等  
上緊修築以備運料之用除咨行度支部分年照數  
給發並札知經過州縣遵照外理合附片陳明伏乞

聖鑒謹

奏

宣統元年十月二十四日



廣豐廠承修

寶城地宮大塔工程單



謹將

崇陵寶城地宮大槽面濶十一丈四尺進深二十三丈一尺冬令  
停工以前現做活計列後

計開

穴中四面均自原地皮起北面剗深一丈四尺東面剗深九  
尺五寸西面剗深七尺南面剗深均四尺為此謹

呈

廣豐木廠謹具





興隆廠承修頭<sup>段</sup>工程情形單

謹將 興隆廠承修

崇陵並 妃園寢頭段工程至冬令停工以前現做活計分晰開列於後

計開

寶城後院當並羅券牆北面地基現起剝深九尺

方城大墻進深六丈六尺月台進深一丈七尺踉蹠進深三丈六尺前餘墻七尺通進深十二丈六尺

方城並月台面闊八丈七尺踉蹠面闊七丈九尺北面剝深八尺五寸南面剝深二尺三寸均折深五尺四寸墻墻築打夯礪深四尺一寸通深九尺五寸

琉璃花門院內海墁下墻墊黃土築打夯礪均深三尺五寸

西北來水河開挖引河長五十八丈上口寬三丈均深五尺

妃園寢羅券牆內院當北一半地基起剝均深二尺五寸



興隆木廠謹具



崇陵各段應需椀木架木數目單

謹將

崇陵各段分修各工應需梳木架木約核數目分晰開後

計開

頭段分修

地宮

寶城

方城

明樓並牆垣泊岸等工需用

長六丈梳木八十八根

通稍架木一萬七千一百六十五根

長短架木二萬四千二百三十四根

二段分修



隆恩殿

石臺五供

琉璃花門並牆垣泊岸等工需用

通稍架木九千八百六十三根

長短架木五千四百八十二根

三段分修

隆恩門

東西配殿

焚帛爐

東西朝房並牆垣泊岸橋座等工需用

通稍架木一千九百九十六根

長短架木三千一百八根

長短架木三千一百八根

四段分修

碑亭

牌樓門望柱

神厨庫各座並牆垣泊岸橋座等工需用

長六丈桅木十二根

通稍架木五千二百九十三根

長短架木六千五百八十七根

以上共計

長六丈桅木壹百根

通稍架木叁萬肆千叁百拾柒根

長短架木叁萬玖千肆百拾壹根





崇陵工程第七十一次報告

肆百玖拾陸

代監督

藏 璋 楊壽軒

監修

王憲章 朱 綸 楊 年

代監修

蔡 鈺 蔡 國 器

辦事官

李廷瑞 廣 蔭 沈承俊 陳 坤 泰 方寶廉 徐 英 詹長 鉅

謹將

廠商具報五月初一日至初四日恭修

崇陵工程詳細情形代監督等逐日查勘無異開具清單恭呈

鈞鑒

計開

地宮 穴中應留吉土分位整打已齊

月牙城院內大槽第一踏蹬第一步築打灰土已齊第一踏蹬第二  
步往北第二層踏蹬第一步築打灰土已齊

方城並月臺大槽地基築打小夯礪第二步灰土加倍充蹠已齊現

打第三步灰土

整打石料

砍磨細甗

潑灰溜土

現拌灰土



以上頭段興隆廣豐等廠恭修

隆恩殿 增內柱頂分位及月臺臺幫分位現打柏木打樁除有山石外

應打打樁一律報齊

琉璃花門

現成搭灰土棚一座

石臺五供

鑿打石料

砍磨細甗

潑灰溜土



潑灰溜土

東北來水河現補築河幫已齊

拉運客土

八旗營房起創地基

以上二段興隆聚源藝和祥和德利德祥東昇合盛祥  
等廠恭修

隆恩門

並前小月臺碼下柏木打樁已齊現柱頂邊樁空當分位續碼

截下柏木樁

兩山面濶牆打柏木打已齊現山石擋當灌漿西進深牆下更  
道泊岸墻內打柏木打已齊山石擋當灌漿

東西

配殿墻內柱頂分位柏木樁並截下加當一律交齊柏木打已齊

東西焚帛爐墻內現打柏木打已齊山石擋當灌漿

東朝房築打柏木打樁已齊



西朝房現打柏木樁並打柏木地打

現成搭灰土棚五座

鑿打石料

砍磨細甌

潑灰溜土

拉運客土

以上三段興隆賓興天和天和等廠恭修

碑亭墻內滿鋪塞門德土二層每層各深一尺作為灰土三步現

在築打小夯碼灰土第四步

東西望柱墻內滿鋪塞門德土二層各深一尺作為灰土三步隨

築打小夯碼灰土第五步

東神廚五間墻內山石擋當滿灌漿已齊

東神廚五間牆內山石搗當滿灌漿已齊

南北庫二座隨打柏木地打已齊山石搗當滿灌漿

省牲亭牆內現築打小夯礮第一步灰土

神廚庫大門並週圍垣牆起創大牆出運渣土隨打柏木地打山石

搗當灌漿廢牆築打灰土隨打小夯礮第一步灰土

五孔大券橋成砌週圍攬水金剛牆

成搭灰土棚

鑿打石料

砍磨細甑

潑灰溜土

現拌灰土

拉運客土



以上四段萬豐中義東昇等廠恭修



地圖寢工程第一百九次報告

陸百

監督 陳宗炳 彝代監督 遊齡 監修 穆霖 張光宇 辦事官 毓圻 李世芳 謹  
田步蟾 朱給 蔡國器 豫震 李廷瑞 崇仁 方寶廉 世培 李世芳

將廠商具報十一月十一日至十五日恭修

妃園寢工程詳細情形監督等逐日查勘無異開列清單恭呈

鈞鑒

計開

東西寶頂甃券鑿打龍鬚溝砍磨細甃

羅券牆鑿打石料砍磨細甃

大殿礫墩現安銀錠

宮門月台

鑿打石料砍磨細甃

應起地 址剷挖運土

鑿打石料砍磨細甃

以上興隆天和賓興天順天泉東昇聚興德利天

和天利等廠恭修





頭段工程已領尚欠各數單

小振

頭段工程錢糧應領已領尚欠數目清單

計開

應領銀二百五十五萬一千九百三十二兩三錢三分八厘

已領銀九十九萬五千兩正已發

尚欠銀一百五十五萬六千九百三十二兩三錢三分八厘



蔣監督等稟發銅活款



敬稟者銅活款今日已發給廠商八萬兩整惟因息款只有七  
萬有餘皆在商號存儲不敷發放係由平餘項下提撥  
為此稟

聞

延鴻謹上  
蔣式堃







售興興隆楠木批票底

第百陸拾貳

今批賣與

興隆寶廠坤甸梭楠木約壹萬方尺之譜言明每丁  
方尺價行平化寶銀貳兩肆錢陸分整其木貨大  
小樣皆經看過言明由七月二十日起貨屢到屢  
交至封河前交齊其尺寸以英尺為准長壹丈五  
六至二丈六七大十五寸至二十四寸貨到津時  
祇要够此尺寸倘與看過兩塊木樣不符准其挑  
別退换較尺較量大頭為准貨有小殘不准任  
意苛求挑剔倘有大殘准其剔出言明在天津紫  
竹林河壩交貨所有外國出口花費脚力稅捐等  
皆歸興隆自理與賣主無干立票現交銀捌千兩  
整下餘貨到時過尺後交清銀兩再行起貨各無  
返悔恐口無憑立此批票二紙各執一張為證

經手人武述堂押

宣統貳年二月初三日恒茂木廠立票



妃園寢工程各廠分修情形稟

王守 第 柒 百 陸 拾 叁

謹將

妃園寢頭段工程各廠段落分晰列後

計開

興隆廠分修二成

西面磚券一座隨月台寶頂

前面隧道一座

龍鬚溝西一半長六十四丈九尺五寸

羅券牆院內除寶頂分位按尺丈折均北一半平墊地勢

西面馬槽溝長八丈六尺

西面泊岸南一半長二十丈並成搭罩棚圈廠棚座等工

後寶山並西面砂山培堆二成

東昇廠分修二成

東面磚券一座隨月台寶頂

前隨隧道一座



龍鬚溝東一半長六十四丈九尺五寸

羅券牆院內除寶頂分位按尺丈折均南一半平墊地勢

西面馬槽溝長八丈六尺

西面泊岸北一半長三十丈並成搭罩棚圈廠棚座等工

後寶山並西面砂山培堆二成

天利廠分修二成

西面羅券牆長二十七丈七尺四寸

隨更道泊岸長二十七丈九尺五寸

西面馬槽溝長十七丈一尺

羅券牆外平墊地勢成搭圈廠棚座等工

羅券牆外平墊地勢成搭圍廠棚座等工

後寶山並西面砂山培堆二成

天和廠分修一成三厘三毫

羅券牆由南往北拐西長十八丈四尺九寸

隨更道泊岸長十八丈六尺三寸

馬槽溝由北往南長十一丈四尺

後寶山並西面砂山培堆一成三厘三毫平墊地勢各隨各段

天順廠分修一成三厘三毫

羅券牆長十八丈四尺九寸

隨更道泊岸長十八丈六尺三寸

馬槽溝長十一丈四尺

後寶山並西面砂山培堆一成三厘三毫平墊地勢各隨各段

聚興永廠分修一成三厘三毫

羅券牆由南往北長十八丈五尺

隨更道泊岸長十八丈六尺四寸

隨踏蹂一分

馬槽溝由北往南長十一丈四尺

後寶山並西面砂山培堆一成三厘三毫平墊地勢各隨各段



宣統二年五月

日



呈進  
崇陵土樣數目單

上海博物院  
藏書百陸拾肆

謹將

呈進

崇陵樣土數目開單呈

鑒

計開

頭段

寶城壹塊  
方城壹塊

貳段

隆恩殿壹塊

琉璃門壹塊

叁段

隆恩門壹塊

配殿壹塊

朝房壹塊

肆段

碑亭壹塊

牌樓門壹塊

望柱壹塊

均底五寸頂三寸高五寸





頭段各商領款數目字

捌百叁拾



此次頭段分領銀拾柒萬陸千陸百兩擬儘數發放計承修

崇陵廠商拾伍萬捌千叁百兩承修

妃園寢廠商壹萬捌千叁百兩請

示遵行

工程處謹呈





公所添購木器清單

呈

謹將

行宮外東西公所添買木器等項覈實銀兩數目分晰列後

計開

八仙桌几十五張 每張三兩四錢 核銀三百二十三兩

椅子六十張 每張一兩九錢 核銀壹百十四兩

抽屜桌九十八張 每張三兩二錢 核銀三百十三兩六錢

杌檯三百五箇 每箇四錢五分 核銀四百七十二兩五錢

二人橙七十箇 每箇四錢 核銀壹百三十三兩

炕桌壹百三大張 每張兩四錢 核銀三百三十四兩二錢

油桌六十六張 每張壹兩五分 核銀六十九兩三錢

縹板橙八十二條 每條五錢五分 核銀四十五兩壹錢

茶杌九十二箇 每箇壹兩二錢 核銀壹百兩二錢

帽筒八十六對 每對二兩二錢 核銀壹百八十九兩二錢

拉運車腳核銀壹百八十五兩

以上添買木器並運車腳統共合實銀貳千二百七十七兩壹錢



具呈 東昇 興隆 木廠 商人 王恒起 馬文藏 呈為懇恩暫請借領賞發  
天利 全榮山

派恭修

西陵暫安處並新建東西各公所工程 商等 鳩工購料趕即興修  
即將挪借各處之款略為彌補而不敷分付者尚多其所  
兼現局工竣開付工價之際愈形拮据 商等 實無另款

監督大人台前轉呈



公 爺 爵 前  
貝 勒 爺 爵 前  
貝 子 爺 爵 前  
中 堂 閣 前 逾格恩施暫請再借領銀拾萬兩以舒 商 困而救

恩准施行謹

呈

宣 統 元 年 月 日 具 呈

呈

具稟呈興隆木廠商人

東昇

王恒起  
馬文斌

稟為石橋加寬趕修不

天利

金榮山

派恭修

暫安處宮門外迤南原有三孔石平橋一座橋面寬一丈六尺五寸奉

諭傳商等當即遵辦奈因日期逼迫一切開山運脚殊屬匪  
枉以資堅固而免有悞要差為此謹

呈



宣統元年 月

日

具呈 東昇局 隆木廠 商人王恆起 馬文臧等為遵

諭核減錢糧事竊 商等蒙

派恭修

西陵暫安處大殿接後護座以及各殿宇房座宮門牆垣並東  
諭再行核減以期樽節 商等遵即將瓦木油石各項材料及  
暫安殿及後護座關係尤為重要擬用老黃松黃花松並錫背早白三  
諄諭何敢因圖省錢糧以致於草率從事今既奉

嚴諭催促再三 商等晝夜焦思只得於無可核減之中  
柒萬叁千壹百拾貳兩伍錢下應領工料實銀貳拾  
將做法細冊一併繕呈總期款不虛糜工堅料實左



監督大人台前轉呈

公 貝勒 貝子 中 堂 閣 前格外恩施俯念 商艱 即行  
賞發錢糧以資接濟急需而重要工則 商等感荷

鴻慈於無極矣謹

呈

宣 統 元 年
